北栄町　橋梁長寿命化修繕計画

令和 5年3月
（令和7年6月　一部改訂）

北　栄　町

１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

北栄町が管理する道路橋217橋に対し橋梁定期点検を実施し、橋の健全度を４段階に評価した。（Ⅰ：健全、Ⅱ：軽微な損傷、Ⅲ：深刻な損傷、Ⅳ：緊急対応）

この結果、217橋のうち75%の164橋にⅡまたはⅢの損傷が確認され、深刻なⅢの損傷は3%（7橋）存在する。

これらの損傷を受けた橋梁群に対して、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・架け替えに要する費用が増大することが懸念される。

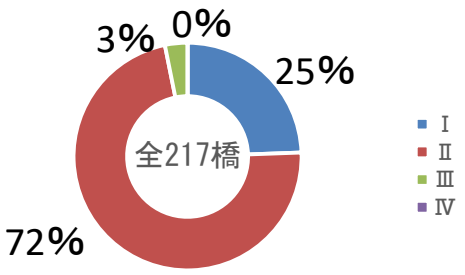

図　橋梁定期点検の結果

２）目的

このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。

コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。

そこで北栄町では、将来的な財政負担の低減および道路交通の持続的な安全性の確保を図るため橋梁長寿命化修繕計画を策定する。計画期間は５年間とし、定期点検によって新たに損傷が発見されるため、点検結果に基づき５年毎に見直し（フォローアップ）を行う。

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

	町道	合計
全管理橋梁数	217	217

長寿命化修繕計画の対象：

・橋梁点検を実施した橋梁

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針
「鳥取県道路橋りょう定期点検マニュアル　平成31年4月　鳥取県」に基づいて定期的（５年毎）に橋梁点検を実施し、橋梁の損傷を早期に把握する。

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針
橋梁を良好な状態を保つため、日常的な維持管理として、パトロール・清掃などの実施を徹底する。

４．個別の施設の状況

橋梁点検の結果を資料Ⅰに示す。

５．新技術等の活用方針

１）橋梁点検
橋梁定期点検のうち、河川に架かる比較的橋長が長い橋梁や多径間の橋梁は、橋梁点検車使用に伴う交通規制の時間が長く、地域住民に与える影響が大きい。このような橋梁に対して、安全性の向上、工期の短縮、コストの縮減、地元住民への影響軽減を図ることを目的に、新技術の「ドローンを用いた近接目視点検支援技術」の活用を検討する。

２）橋梁補修
橋梁補修工事では、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供システム（NETIS）」を活用する等、維持管理に関する最新技術の活用を図る。鋼材の腐食対策について、黒錆転換による高い防食効果で塗装サイクルの長期化が可能になり、再塗装の素地調整が不要な「錆転換型防食塗装システム　サビバリアー」【NETIS　CB-170003-VR】の採用を検討する。

また塩害・中性化による劣化対策について、亜硝酸リチウムを混入した断面修復材を用いて、鉄筋腐食抑制効果を最大限発揮することができる「亜硝酸リチウム併用型断面修復工法」【NETIS CG-220003-A】の採用を検討する。

６．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する具体的な方針

１）基本的な方針

本町が管理する橋梁の中で、架設後30年以上経過した橋梁は全体の約76%を占めているため、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される。したがって、計画的かつ予防的な修繕対策の実施へと転換を図り、橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし、修繕及び架替えに要するコストを縮減する。

２）橋梁の集約・撤去

本町が管理する橋梁のうち、地域の実情や利用状況を踏まえつつ、集約・撤去が有効と判断する橋梁について対策方針を検討する。

・対象橋梁近辺に迂回路がある橋梁。
・橋梁利用者が少ない橋梁。
・【早期措置段階Ⅲ】の橋梁。

上記の項目に該当する橋梁（1橋）を集約・撤去の対象とし、令和9年までに1000万円の維持管理コストの縮減を目標に取り組む。

３）新技術の活用

〈橋梁定期点検〉

橋梁定期点検のうち、河川に架かる比較的橋長が長い橋梁や多径間の橋梁は、橋梁点検車使用に伴う交通規制の時間が長く、地域住民に与える影響が大きい。このような橋梁に対して、安全性の向上、工期の短縮、コストの縮減、地元住民への影響軽減を図ることを目的に、新技術の「ドローンを用いた近接目視点検支援技術」の活用を検討する。

コスト縮減の効果が期待できる橋長100m以上の橋梁（1橋）を対象とする。

短期的な数値目標として、次回３巡目点検（令和9年）にて交通規制の短縮と7割程度（70万円）のコストの縮減を目標に取り組む。

〈橋梁定期点検〉

橋梁補修工事では、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供システム(NETIS)」を活用する等、維持管理に関する最新技術の活用を図る。鋼材の腐食対策について、黒錆転換による高い防食効果で塗装サイクルの長期化が可能になり、再塗装の素地調整が不要な「錆転換型防食塗装システム　サビバリアー」【NETIS　CB-170003-VR】の採用を検討する。

上記の新技術を活用し、本町にある鋼橋(1橋)に対して、50年間のLCCを計算した結果、4割程度(160万円)のコストの縮減を目標に取り組む。

7．対策優先順位の決定

1）対策優先順位
対策優先順位は、橋梁定期点検結果および、損傷の劣化予測に基づく【損傷度】と、橋梁の【重要度】により、右表に示す順位となる。

表　対策優先順位

		重要度		損傷具合
		高	低	
損傷度	高	1	3	悪
	中	2	5	↕
	低	4	6	良

2）損傷度
損傷度は、定期点検の結果をもとに劣化予測を行い、損傷具合により判断する。

3）重要度

対策順位決定のため、橋毎の重要度を設定する。
重要度は、橋が位置する路線の道路種別により判断する。

・幹線道路　　重要度　高
・その他町道　重要度　低

8.計画期間内の修繕内容・時期

資料Ⅱに示す。

9.各橋梁の対策内容と対策費用

資料Ⅲに示す。

１０．長寿命化修繕計画による効果

長寿命化修繕計画を策定する217橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来の対症療法型が32億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が9億円となり、コスト縮減効果は23億円となる。
また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。

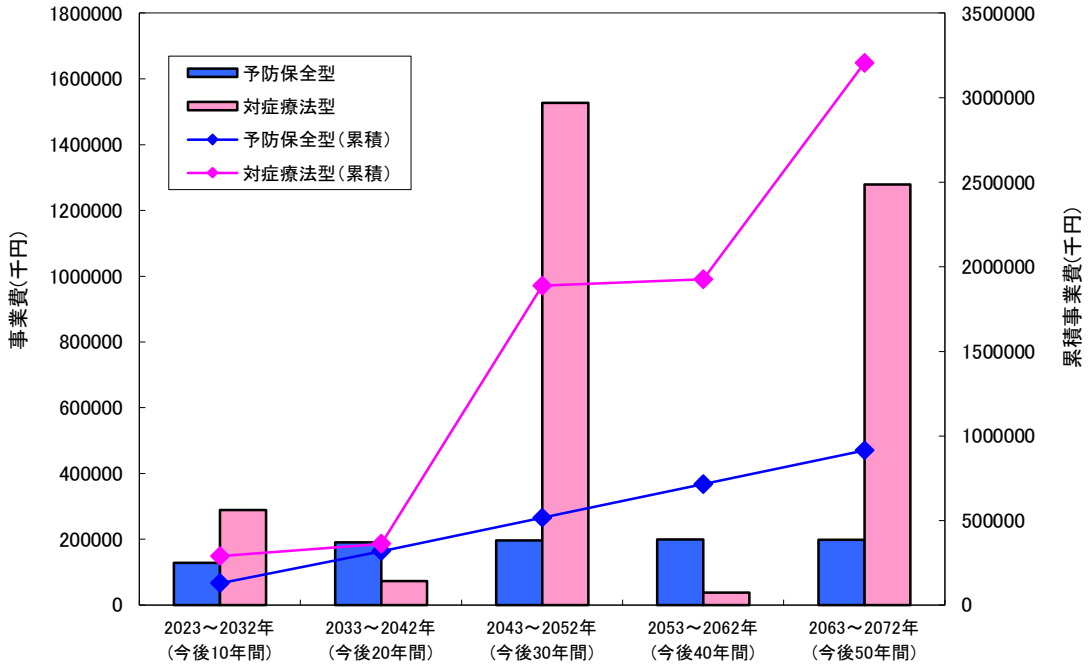

１１．計画策定担当部署

１）計画策定担当部署
北栄町　地域整備課　tel：0858-37-3117

【資料Ⅰ】橋梁点検の結果

北栄町　橋梁定期点検結果一覧表

番号	フリガナ 道路橋名	路線名	橋長(m)	全幅員(m)	径間数	架設年次	点検年度	構造形式	定期点検【2巡目】 健全性の診断　判定区分(Ⅰ～Ⅳ)						
									道路橋毎	上部構造			下部構造(側壁)	支承部	その他
										主桁	横桁	床版(頂版)			
1	ミヤノワキハシ 宮ノ脇橋	町道米里大野線	3.00	17.00	1	2000	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ
2	ナガハタケハシ 長畑橋	町道米里大野線	2.00	6.45	1	1978	R3	RC床版橋	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ
3	クドリハシ 九鳥橋	町道米里大野線	3.00	9.00	1	1978	R2	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
4	ドイシタハシ1 土居下橋1	町道米里大野線	4.40	21.85	1	1975	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
5	ダイ2ナカハマベハシ 第2中浜辺橋	町道下神江北浜線	4.00	10.00	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ
6	ヒガシタナカハシ 東田中橋	町道下神江北浜線	5.50	4.40	1	不明	R1	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ
7	ヒエダハシ ヒエ田橋	町道下神江北浜線	13.00	6.60	1	1962	R4	RCT桁橋	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ
8	ホウスイロ6ゴウハシ 放水路6号橋	町道下神江北浜線	38.40	6.20	1	2007	R3	鋼I桁橋	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ
9	ダイ1オリカエシハシ 第1折返橋	町道松神水源地線	13.20	6.80	1	1963	R4	PC中空床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
10	ダイ1オオバタケハシ 第1大畑ケ橋	町道國坂國坂浜線	2.95	7.20	1	1979	R4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ
11	ヤクシドウハシ 薬師堂橋	町道江北西新田場線	2.10	7.35	1	1978	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
12	ダイ1オウジンミチハシ 第1応神道橋	町道江北西新田場線	2.35	8.40	1	1975	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
13	ダイ2オウジンミチハシ 第2応神道橋	町道江北西新田場線	2.60	6.80	1	1972	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
14	ハタケダハシ 畑ケ田橋	町道江北西新田場線	7.20	7.50	1	1972	R2	RCT橋	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ
15	オオツボハシ1 大坪橋1	町道國坂浜江北線	3.10	16.65	1	1959	R1	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅱ
16	カワナカハシ 河中橋	町道國坂浜江北線	5.10	5.45	1	1968	R3	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
17	ニシノウタハシ 西濃田橋	町道國坂浜東新田場線	2.10	11.70	1	1979	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
18	ダイ1ノウタハシ 第1農田橋	町道國坂浜東新田場線	2.20	7.55	1	1979	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
19	シタゲンギンアミミチハシ 下現銀網道橋	町道國坂浜東新田場線	3.13	5.48	1	1972	R2	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
20	シモヤツハシ 下八ツ橋	町道弓原北尾曲線	2.70	6.40	1	1978	R2	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
21	ホノカハシ 穂ノ香橋	町道弓原北尾曲線	3.00	11.40	1	1978	R3	RC床版橋	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
22	センダハシ 先田橋	町道弓原北尾曲線	3.30	9.40	1	1978	R3	RC床版橋	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
23	ヒガシヤシキハシ 東屋敷橋	町道弓原北尾曲線	2.80	9.80	1	1957	R2	RC床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
24	カマダニハシ 釜谷橋	町道弓原北尾曲線	7.00	9.55	1	1978	R3	PC桁橋 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
25	キタオハシ きたお橋	町道弓原北尾曲線	11.00	5.60	1	1967	R4	鋼H桁橋	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
26	シマサワハシ 島沢橋	町道米里曲線	11.40	7.30	1	1977	R1	PC床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ
27	ダイ2オオバタケハシ 第2大畑ケ橋	町道國坂四ツ筋線	2.20	17.60	1	1983	R4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ
28	ハシ スタラ橋	町道松神曲１号線	4.60	4.80	1	不明	R1	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ
29	シモゴノツボハシ 下五ノ坪橋	町道國坂江北線	3.20	8.87	1	2000	R4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ
30	イシガツボハシ 石ケ坪橋	町道國坂江北線	2.85	26.00	1	2000	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
31	ムメイハシ1 無名橋1	町道江北１号線	9.60	7.90	1	2000	R4	PCI桁橋	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
32	ダイ2イチゴシロダニハシ 第2壱後谷橋	町道東新田場２号線	2.20	5.20	1	1979	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
33	シタコウジンハシ 下荒神橋	町道江北３号線	7.00	6.00	1	2000	R4	RC床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ
34	ダイ1ウシロタニハシ 第1壱後谷橋	町道江北浜３号線	2.30	5.80	1	1979	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
35	サギタハシ 鷺田橋	町道西新田場１号線	3.20	7.20	1	1972	R2	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ
36	ダイ1ミナミシオタハシ 第1南潮田橋	町道西新田場２号線	2.20	7.20	1	1972	R2	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ
37	ヤマシタハシ 山下橋	町道西新田場３号線	2.70	6.35	1	1972	R3	RC床版橋	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ
38	カミマエダハシ1 上前田橋1	町道江北７号線	7.00	9.90	1	1967	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ
39	シモマエダハシ 下前田橋	町道江北１２号線	3.20	3.00	1	1953	R3	RC床版橋	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ
40	ナカマエダハシ 中前田橋	町道江北２３号線	3.30	5.12	1	1953	R1	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ
41	ムメイハシ2 無名橋2	町道みどり１号線	2.90	11.60	1	2000	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ
42	ナカホッパラハシ 中発原橋	町道みどり１号線	3.00	9.90	1	1977	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
43	ダイ1ダキョウジハシ 第1駄経寺橋	町道みどり４号線	2.40	8.05	1	1974	R3	RC床版橋	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ
44	ダイ2ダキョウジハシ 第2駄経寺橋	町道みどり５号線	2.40	5.65	1	1974	R3	RC床版橋	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ
45	ダイ3ダキョウジハシ 第3駄経寺橋	町道みどり６号線	2.50	7.98	1	1977	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
46	コヅツミハシ 小包橋	町道國坂浜１号線	3.00	16.60	1	1976	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ
47	オオゴデンハシ 大昔田橋	町道國坂浜2号線	4.00	6.15	1	1976	R4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	-	-	Ⅱ
48	ホウスイロ5ゴウハシ 放水路5号橋	町道下神國坂浜線	37.20	8.20	1	2006	R2	PCT桁橋	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ
49	トノハシ 兎野橋	町道大野西新田場線	2.70	7.25	1	1972	R2	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ

北栄町　橋梁定期点検結果一覧表

番号	フリガナ 道路橋名	路線名	橋長(m)	全幅員(m)	径間数	架設年次	点検年度	構造形式	定期点検【2巡目】 健全性の診断　判定区分(Ⅰ～Ⅳ)						
									道路橋毎	上部構造			下部構造(側壁)	支承部	その他
										主桁	横桁	床版(頂版)			
50	ダイ3オオバタケハシ 第3大畑ケ橋	町道國坂1号線	2.20	6.00	1	2000	R4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ
51	カミナカヤシキハシ 上中屋敷橋	町道國坂2号線	2.10	15.25	1	1988	R4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅱ
52	ハマベハシ 浜辺橋	町道田井１号線	5.30	4.85	1	1978	R2	PC中空床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
53	タイハシ 田井橋	町道田井３号線	5.30	4.80	1	1979	R2	PC中空床版橋	Ⅱ	Ⅰ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
54	シモナルタハシ 下平田橋	町道中央1号線	3.45	6.97	1	2000	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅱ
55	ドイシタハシ2 土居下橋2	町道中央1号線	4.40	8.35	1	2000	R4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
56	ダイ1ダイニチハシ 第1大日橋	町道中央2号線	2.20	6.30	1	1975	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	-	-	Ⅱ
57	ダイ2ダイニチハシ 第2大日橋	町道中央3号線	2.20	6.60	1	1975	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
58	ダイ1マエダハシ 第1前田橋	町道北尾土下線	4.15	3.30	1	1974	R2	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
59	ダイ2マエダハシ 第2前田橋	町道土下１号線	5.30	9.30	1	1979	R3	RC床版橋	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
60	マルヤマハシ 丸山橋	町道土下１２号線	3.60	9.70	1	2000	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ
61	ダイ2イチノサキハシ 第2一の崎橋	町道米里北尾線	2.10	6.45	1	1960	R2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ
62	クシノウハシ 訓脳橋	町道米里北尾線	2.20	10.65	1	1960	R1	RC床版橋 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ
63	ゴノハナハシ 五ノ鼻橋	町道米里１０号線	8.80	3.40	1	1981	R2	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
64	オオマチハシ 大町橋	町道米里１２号線	11.50	5.00	1	1987	R3	PC中空床版橋	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
65	サンノサキハシ 三ノ崎橋	町道米里14号線	14.60	5.00	1	2000	R4	PC中空床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
66	イチノサキハシ 一の崎橋	町道米里17号線	13.00	7.90	1	2000	R4	PC中空床版橋	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
67	マエマチハシ 前町橋	町道島１号線	12.60	4.75	1	1971	R1	PC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
68	シロノウチハシ 城ノ内橋	町道島４号線	11.40	4.70	1	1972	R1	PC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
69	シマハシ 島橋	町道島１２号線	12.40	5.89	1	1954	R1	PC床版橋	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	-	Ⅲ
70	タケノシタハシ 竹下橋	町道島１３号線	10.40	4.10	1	1970	R3	PC桁橋	Ⅰ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
71	ハッタンダハシ 八反田橋	町道島土下線	13.25	6.20	1	1992	R1	PC床版橋	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
72	ハシタキタオセン1ゴウハシ 土下北尾線1号橋	町道土下北尾線	3.50	6.00	1	2000	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ
73	キタオシンハシ 北尾新橋	町道土下北尾線	14.50	7.45	1	2000	R4	PC中空床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
74	ハイザキハシ 灰崎橋	町道島北尾6号線	5.80	5.60	1	2006	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ
75	ハマカワハシ1 浜川橋1	町道弓原１号線	5.30	5.30	1	1978	R3	PC桁橋	Ⅰ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
76	ニシザワハシ 西沢橋	町道弓原２号線	3.40	6.75	1	1975	R2	RC床版橋 PC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅱ	-	Ⅰ
77	ダイ1ナカハマベハシ 第1中浜辺橋	町道弓原２号線	4.00	15.00	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ
78	タケガハナハシ 竹ケ鼻橋	町道弓原２号線	11.00	4.60	1	1965	R1	RCT桁橋	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
79	モトマチハシ 本町橋	町道弓原9号線	11.00	6.20	1	1965	R4	PCT桁橋	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
80	マツモトハシ 松本橋	町道下神３号線	11.00	6.02	1	1965	R1	RCT桁橋	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
81	エンザキハシ 円崎橋	町道下神4号線	11.00	3.50	1	1954	R4	RCT桁橋	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ
82	オキタハシ 沖田橋	町道下神曲線	4.60	3.80	1	不明	R2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ
83	アカタハシ 赤田橋	町道松神曲２号線	4.60	4.80	1	1954	R2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ
84	オオツボハシ2 大坪橋2	町道松神曲３号線	5.75	4.80	1	不明	R2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ
85	ダイニヤシキハシ 第二屋敷橋	町道松神1号線	12.70	6.30	1	2000	R4	RCT桁橋 PC中空床版橋	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ
86	ホウスイロ3ゴウハシ 放水路3号橋	町道弓原松神線	37.20	8.20	1	2005	R4	PCT桁橋	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
87	ダイイチサカネハシ 第一坂根橋	町道曲４号線	3.40	4.56	1	2000	R3	RC床版橋	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
88	ダイニサカネハシ 第二坂根橋	町道曲５号線	2.80	6.80	1	1965	R3	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
89	セドハシ 背戸橋	町道江北32号線	2.30	8.53	1	1982	R4	RC床版橋	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
90	シモホッパラハシ 下発原橋	町道みどり12号線	2.45	8.65	1	2000	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
91	シノツボハシ 四ノ坪橋	町道みどり17号線	2.90	8.75	1	2000	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
92	ダイイチサンノツボハシ 第一三ノ坪橋	町道みどり19号線	3.75	9.95	1	2000	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
93	ダイニサンノツボハシ 第二三ノ坪橋	町道みどり20号線	3.75	9.95	1	2000	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
94	マエダハシ1 前田橋1	町道土下13号線	4.15	13.92	1	2000	R4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅲ	-	-	Ⅲ	Ⅰ	-	Ⅰ
95	イナドハシ 稲戸橋	町道江北33号線	2.60	16.00	1	2000	R4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	-	-	Ⅰ
96	ミズツキハシ 水つき橋	町道曲１２号線	3.10	4.80	1	2000	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ
97	ムメイハシ3 無名橋3	町道松神國坂線	2.75	5.10	1	2000	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
98	ダイニクニサカハシ 第二國坂橋	町道松神國坂線	4.10	5.40	1	2000	R4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	-	-	Ⅰ

北栄町　橋梁定期点検結果一覧表

番号	フリガナ 道路橋名	路線名	橋長(m)	全幅員(m)	径間数	架設年次	点検年度	構造形式	定期点検【2巡目】 健全性の診断　判定区分(Ⅰ～Ⅳ)						
									道路橋毎	上部構造			下部構造(側壁)	支承部	その他
										主桁	横桁	床版(頂版)			
99	ハマカワハシ2 浜川橋2	町道松神國坂線	6.30	18.10	1	1987	R2	RCT桁橋 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ
100	ムメイハシ5 無名橋5	町道松神國坂線	10.90	4.60	1	2000	R4	RCT桁橋	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
101	ホウスイロ9ゴウハシ 放水路9号橋	町道松神國坂線	37.40	6.20	1	2007	R4	PCT桁橋	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
102	ムメイハシ6 無名橋6	町道田井大野線	4.80	5.80	1	2000	R4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅱ
103	ムメイハシ7 無名橋7	町道さくら1号線	3.80	8.95	1	2000	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
104	ムメイハシ8 無名橋8	町道さくら2号線	3.80	8.95	1	2000	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
105	マガリ16ゴウセン1ゴウハシ 曲16号線1号橋	町道曲１６号線	2.20	15.50	1	2000	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅱ	-	Ⅱ
106	ハシタ16ゴウセン1ゴウハシ 土下16号線1号橋	町道土下１６号線	3.60	14.10	1	2000	R3	RC床版橋	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
107	ムメイハシ9 無名橋9	町道國坂１５号線	2.96	6.95	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ
108	ムメイハシ10 無名橋10	町道江北浜１６号線	7.40	3.20	1	不明	R3	RC床版橋	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
109	ヒガシハマベバシ 東浜辺橋	町道北条北線	7.10	17.30	1	不明	R2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ
110	キタオハシ 北尾橋	町道北条西線	14.60	21.90	1	1978	R3	PC中空床版橋	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
111	ホウスイロ7ゴウハシ 放水路7号橋	町道放水路左岸線	37.10	6.20	1	2008	R1	PC中空床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
112	ホウスイロ8ゴウハシ 放水路8号橋	町道放水路左岸線	37.00	6.20	1	2007	R4	PCT桁橋	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
113	ホウスイロ4ゴウハシ 放水路4号橋	町道放水路左岸線	37.30	8.20	1	2005	R4	PCT桁橋	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ
114	カジアミハシ 梶網橋	町道梶網線	3.60	8.00	1	1995	R4	RC床版橋 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
115	マエカワハシ 前川橋	町道二軒屋裏線	17.90	5.20	1	1991	R1	PC床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
116	ウラモンバシ 裏門橋	町道台場線	80.00	5.20	1	1993	R3	鋼I桁橋	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
117	アジサイハシ あじさい橋	町道川端通線	17.95	5.50	1	2000	R1	PC床版橋	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
118	チョウエイジュウタクヒガシハシ 町営住宅東橋	町道油町通線	2.65	5.60	1	不明	R1	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ
119	ニジョウハシ 二条橋	町道油町通線	20.60	5.30	1	1991	R4	鋼H桁橋	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ
120	カミタニガワハシ 上谷川橋	町道寺町通線	2.50	2.70	1	1953	R2	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ
121	サンジョウハシ 三条橋	町道寺町通線	14.60	4.60	1	1935	R1	RCT桁橋	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ
122	ヒヨリムコウハシ 日和向橋	町道日和川通線	4.55	3.35	1	1940	R2	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅱ
123	シアンハシ 思案橋	町道浜宮町通線	4.25	3.95	1	1940	R2	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ
124	ダイイチトンドハシ 第一とんど橋	町道田町南線	15.40	4.20	1	1995	R1	PC床版橋	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
125	コハシ 小橋	町道揚村通線	6.95	3.25	1	1978	R3	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
126	ハイタケハシ 配竹橋	町道育英東線	2.90	7.55	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ
127	テイシャジョウハシ 停車場橋	町道駅前西線	16.40	10.95	1	1995	R4	PC中空床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
128	エキナンハシ 駅南橋	町道大栄小中学校線	17.00	9.80	1	2001	R4	PC中空床版橋	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
129	チョウエイジュウタクナカハシ 町営住宅中橋	町道由良保育所前線	2.40	7.52	1	不明	R2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ
130	タチカワハシ1 立川橋1	町道由良保育所前線	4.05	5.35	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ
131	オダイバオオハシ お台場大橋	町道台場南線	139.40	7.20	1	1980	R3	PCT桁橋	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ
132	ツマナミシタハシ 妻波下橋	町道徳山高見線	2.60	1.00	1	不明	R2	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ
133	ツマナミハシ 妻波橋	町道妻波青木線	19.90	7.20	1	1984	R3	PCT桁橋	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
134	カミマエダハシ2 上前田橋2	町道妻波大谷線	5.00	6.10	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ
135	ニシバラハシ 西原橋	町道妻波大谷線	5.10	6.00	1	不明	R2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ
136	シモジョウダニハシ 下上谷橋	町道妻波南大谷線	3.50	6.20	1	1977	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
137	オオダニヒガシハシ 大谷東橋	町道大谷青木線	16.60	7.20	1	1983	R3	PCT桁橋	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
138	バンノキハシ 番ノ木橋	町道大谷青木線	20.60	7.20	1	1979	R3	PCT桁橋	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ
139	シンツツミシタハシ 新堤下橋	町道比山大谷南線	3.35	6.60	1	1979	R4	RC床版橋	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
140	イノウエハシ 井上橋	町道妻波鞍塚線	19.90	7.20	1	1984	R3	PCT桁橋	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ
141	タカエオオタニダイ2ゴウハシ 高江大谷第2号橋	町道高江大谷線	2.00	6.60	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ
142	タカエオオタニダイ1ゴウハシ 高江大谷第1号橋	町道高江大谷線	6.80	7.00	1	不明	R2	PC中空床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
143	マエダハシ2 前田橋2	町道大谷新川桜池線	4.93	12.30	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ
144	ツカバタケハシ 塚畑橋	町道大谷新川桜池線	19.90	7.20	1	1983	R2	PCT桁橋	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ
145	ハラタハシ 原田橋	町道神楽田道線	2.50	4.90	1	不明	R1	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅱ	-	Ⅰ
146	マエダシタハシ 前田下橋	町道六尾配竹南線	3.25	3.25	1	不明	R2	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ
147	ニシホナミハシ 西穂波橋	町道干目西穂波線	8.65	7.70	1	不明	R2	PC中空床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ

北栄町　橋梁定期点検結果一覧表

番号	フリガナ 道路橋名	路線名	橋長(m)	全幅員(m)	径間数	架設年次	点検年度	構造形式	定期点検【2巡目】 健全性の診断　判定区分(Ⅰ～Ⅳ)						
									道路橋毎	上部構造			下部構造(側壁)	支承部	その他
										主桁	横桁	床版(頂版)			
148	ムツオハシ 六尾橋	町道六尾通り線	3.60	6.60	1	1979	R4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	-	-	Ⅱ
149	マエダハシ3 前田橋3	町道六尾通り線	3.20	5.10	1	不明	R3	RC床版橋	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
150	ムツオヒガシオキハシ 六尾東沖橋	町道六尾通り線	2.20	4.95	1	不明	R2	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
151	エイタイハシ 永代橋	町道子守神社道線	3.40	4.18	1	不明	R2	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
152	ミヤノシタハシ 宮下橋	町道瀬戸神社道線	30.50	4.80	1	1967	R3	鋼H桁橋	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
153	モリミツハシ 森光橋	町道西園道線	6.70	4.80	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ
154	ニシノハシ 西園橋	町道西園村中道線	9.60	6.55	1	不明	R3	RCT桁橋	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
155	イッポンハシ 一本橋	町道西園村中道線	11.80	3.60	1	不明	R4	RCT桁橋	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
156	ニシノナカハシ 西園中橋	町道西園村中道線	11.80	3.60	1	不明	R4	RCT桁橋	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
157	クロカワハシ 黒川橋	町道東園学利道線	3.22	23.80	1	不明	R3	RC床版橋	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
158	ヒガシソノヨコラ1ゴウハシ 東園横良1号橋	町道東園学利道線	6.75	7.50	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ
159	ニシバシ 西橋	町道東園村中道線	12.10	6.00	1	1979	R1	PC床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
160	ハラ1ゴウハシ 原1号橋	町道原道線	2.70	5.30	1	不明	R2	RC床版橋	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
161	ハラ2ゴウハシ 原2号橋	町道原道線	5.60	6.20	1	不明	R2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅱ
162	カガマエハシ 加賀前橋	町道大川道線	29.50	2.90	1	1969	R3	鋼H桁橋	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
163	カメジリハシ 亀尻橋	町道亀尻道線	2.60	19.70	4	1953	R1	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ
164	ヒガシソノナカハシ 東園中橋	町道大網道線	10.90	4.60	1	1940	R4	RCT桁橋	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
165	ニシノヨコラ1ゴウハシ 西園横良1号橋	町道西園学利道線	6.70	4.80	1	1968	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ
166	ツルバミハシ 鶴喰橋	町道西園瀬戸線	6.70	7.00	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ
167	ヒガシソノハラダイ1ゴウハシ 東園原第1号橋	町道東園原第１号線	2.95	4.35	1	1955	R3	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ
168	ヒガシソノハラダイ2ゴウハシ 東園原第2号橋	町道東園原第１号線	5.60	4.80	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ
169	シタンダ ハシ 四反田橋	町道東園原第２号線	3.05	4.93	1	不明	R1	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅱ
170	ミヤミツハシ 宮光橋	町道東園原第２号線	5.60	4.80	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ
171	ニシノハシ 西の橋	町道西園国道線	11.80	4.65	1	1957	R1	RCT桁橋	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
172	マツガキハシ 松垣橋	町道下種今在家線	18.40	4.60	1	1970	R1	RCT桁橋	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ
173	ノダ ハシ 野田橋	町道岩坪今在家線	2.60	7.60	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ
174	オオハシ 大橋	町道岩坪今在家線	21.00	3.70	1	1971	R4	鋼H桁橋	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
175	カキノウチハシ 垣ノ内橋	町道上種垣内線	12.55	4.55	1	不明	R1	RCT桁橋	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ
176	ヒナジョウハシ 陽な場橋	町道東屋敷西屋敷線	11.00	4.60	1	不明	R4	PCT桁橋	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ
177	ヒガシタカオハシ 東高尾橋	町道上種東高尾線	18.90	7.70	1	1992	R1	PC床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ
178	マエダハシ4 前田橋4	町道亀谷向屋敷線	5.05	3.35	1	不明	R2	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ
179	シモザカマエハシ 下坂前橋	町道亀谷向屋敷線	7.00	4.70	1	不明	R4	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
180	カイダニハシ 貝谷橋	町道西高尾東高尾線	4.65	3.40	1	1959	R3	RC床版橋	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ
181	ミヤハシ 宮橋	町道西高尾東高尾線	8.40	4.80	1	1972	R3	PC床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ
182	ニシノノシンバシ 西園新橋	町道西園旧国道線	19.50	5.20	1	2000	R4	PC中空床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
183	ユラテイシャジョウハシ 由良停車場橋	町道由良関金線	5.35	6.30	1	1955	R1	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ
184	イワイガミハシ 岩井神橋	町道観音谷岩井神線	3.40	8.80	1	不明	R1	RC床版橋 RCT桁橋	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅱ
185	ヒガシソノジンジャヒガシハシ 東園神社東橋	町道東園日本隠線	12.90	9.50	1	1999	R4	PC中空床版橋	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
186	マエシンデンシ 前新田橋	町道島明り隈西穂波線	3.00	6.00	1	不明	R2	RC床版橋	Ⅲ	-	-	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ
187	オオクマハシ 大隈橋	町道島明り隈西穂波線	22.40	4.70	1	1971	R4	鋼H桁橋	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ
188	イケナワテニシハシ 池畷西橋	町道島北縦貫線	3.83	5.00	1	不明	R1	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅱ	-	Ⅱ
189	オオクマコハシ 大隈小橋	町道島中橋山鼻線	3.40	6.00	1	不明	R2	RC床版橋	Ⅲ	-	-	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ
190	ナカシマハシ 中島橋	町道島中橋山鼻線	17.60	5.20	1	1984	R1	PC床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
191	カナケコハシ 金毛小橋	町道島日焼金毛線	3.20	6.00	1	不明	R3	RC床版橋	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
192	キタイソナワテノハシ 北磯畷ノ橋	町道島日焼金毛線	3.80	5.00	1	不明	R1	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ
193	カナケハシ 金毛橋	町道島日焼金毛線	22.30	4.70	1	1971	R4	鋼H桁橋	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ
194	シングウハシ 新宮橋	町道東高尾西高尾線	9.40	9.10	1	1985	R3	PC桁橋	Ⅰ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
195	エキナンホドウハシ 駅南歩道橋	町道ハトマ南線	35.30	1.90	1	1975	R2	鋼H桁橋	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ
196	ヒガシノヒガシハシ 東園東橋	町道東園工場団地線	10.90	4.50	1	不明	R1	RCT桁橋	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ

北栄町　橋梁定期点検結果一覧表

番号	フリガナ 道路橋名	路線名	橋長(m)	全幅員(m)	径間数	架設年次	点検年度	構造形式	定期点検【2巡目】 健全性の診断　判定区分(Ⅰ～Ⅳ)						
									道路橋毎	上部構造			下部構造(側壁)	支承部	その他
										主桁	横桁	床版(頂版)			
197	ヒガシカメタニバシ 東亀谷橋	町道東亀谷津原線	16.40	4.80	1	1970	R1	鋼H桁橋	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
198	セトハシ 瀬戸橋	町道瀬戸橋線	32.40	6.80	1	2015	R2	PC桁橋	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ
199	カミサカハシ 上坂橋	町道東高尾上坂線	9.50	4.80	1	不明	R2	PC床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ
200	シモサカハシ 下坂橋	町道東高尾下坂線	13.50	5.80	1	不明	R1	PC床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
201	エキニシホドウハシ 駅西歩道橋	町道由良別所線	72.90	3.40	1	1984	R3	鋼I桁橋	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ
202	フナイソハシ 船磯橋	町道六尾南・西穂波線	3.40	5.40	1	不明	R1	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅱ	-	Ⅰ
203	ハラミナミハシ 原南橋	町道原南線	2.70	6.05	1	不明	R1	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ
204	ニケンヤハシ 二軒屋橋	町道六尾大谷線	3.00	6.45	1	1962	R1	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅱ	-	Ⅱ
205	オオダニハシ 大谷橋	町道六尾大谷線	2.60	6.10	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ
206	オオダニシハシ 大谷西橋	町道六尾大谷線	3.00	17.00	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ
207	タチカワハシ2 立川橋2	町道六尾大谷線	4.00	9.50	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ
208	シンカワハシ 新川橋	町道六尾大谷線	4.90	16.00	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ
209	ユラハシ 由良橋	町道六尾大谷線	7.55	17.20	1	1991	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ
210	マチナカハシ 町中橋	町道六尾大谷線	15.20	7.20	1	1994	R3	PCT桁橋	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
211	ナカハシ 中橋	町道亀谷中橋線	17.60	10.20	1	1994	R1	PC床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
212	テラハシ 寺橋	町道西高尾向ヒ田線	9.50	4.80	1	不明	R3	RC床版橋	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ
213	ニゴウムメイハシ 二号無名橋	町道旧杉下倉吉線	2.55	4.00	1	不明	R3	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
214	ヨウスイハシ 用水橋	町道旧法万大栄線	3.60	4.40	1	不明	R1	RC床版橋	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ
215	オオダニマエカワジリハシ 大谷前川尻橋	町道大谷９号側道線	4.10	6.20	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ
216	シンザカワジリハシ 新座川尻橋	町道大谷９号側道線	4.50	4.80	1	不明	R3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ
217	タカエハシ 高江橋	町道由良別所線	16.50	8.20	1	1998	R4	PC中空床版橋	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ

【資料Ⅱ】計画期間内の修繕内容・時期

：補修対象橋梁

番号	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	所在地	構造形式	最新点検年次	判定区分	対策の内容・時期				
												R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)
1	宮ノ脇橋	幹線	米里大野線	3.0	16.0	2000	23	土下	BOX	2021	Ⅰ				3巡目点検	
2	長畑橋	幹線	米里大野線	2.0	6.0	1978	45	国坂	RC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
3	九鳥橋	幹線	米里大野線	3.0	9.0	1978	45	国坂	RC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
4	土居下橋１	幹線	米里大野線	4.4	21.9	1975	48	土下	RC橋	2021	Ⅱ			3巡目点検		
5	第２中浜辺橋	幹線	下神江北浜線	4.0	9.2	1953	70	弓原	BOX	2021	Ⅰ				3巡目点検	
6	東田中橋	幹線	下神江北浜線	5.5	4.0	1958	65	江北	RC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
7	ヒエ田橋	幹線	下神江北浜線	13.0	6.0	1962	61	下神	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
8	放水路６号橋	幹線	下神江北浜線	38.4	5.0	2007	16	弓原	鋼橋	2021	Ⅲ				3巡目点検	
9	第１折返橋	幹線	松神水源地線	13.2	6.0	1963	60	松神	PC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
10	第１大畑ケ橋	幹線	國坂國浜線	3.0	6.8	1979	44	国坂	BOX	2022	Ⅱ					3巡目点検
11	薬師堂橋	幹線	江北西新田場線	2.1	7.1	1978	45	江北	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
12	第１応神道橋	幹線	江北西新田場線	2.4	7.9	1975	48	江北	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
13	第２応神道橋	幹線	江北西新田場線	2.6	6.3	1972	51	江北	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
14	畑ケ田橋	幹線	江北西新田場線	7.2	7.5	1972	51	江北	RC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
15	大坪橋１	幹線	國坂浜江北線	3.1	4.3	1959	64	江北	BOX	2019	Ⅱ		3巡目点検			
16	河中橋	幹線	國坂浜江北線	5.1	4.6	1968	55	江北	RC橋	2021	Ⅱ				3巡目点検	
17	西濃田橋	幹線	國坂浜東新田場線	2.1	11.3	1979	44	江北	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
18	第１農田橋	幹線	國坂浜東新田場線	2.2	5.2	1979	44	江北	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
19	下現銀網道橋	幹線	國坂浜東新田場線	3.1	5.5	1972	51	江北	RC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
20	下八ツ橋	幹線	弓原北尾曲線	2.7	6.4	1978	45	北尾	RC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
21	穂ノ香橋	幹線	弓原北尾曲線	3.0	10.8	1978	45	北尾	RC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
22	先田橋	幹線	弓原北尾曲線	3.3	9.0	1978	45	曲	RC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
23	東屋敷橋	幹線	弓原北尾曲線	2.8	9.8	1957	66	弓原	RC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
24	釜谷橋	幹線	弓原北尾曲線	7.0	8.8	1978	45	曲	PC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
25	きたお橋	幹線	弓原北尾曲線	11.0	5.0	1967	56	弓原	鋼橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
26	島沢橋	幹線	米里曲線	11.4	6.5	1977	46	北条島	PC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
27	第２大畑ケ橋	幹線	國坂四ツ筋線	2.2	17.0	1983	40	国坂	BOX	2022	Ⅱ					3巡目点検
28	スタラ橋	幹線	松神曲１号線	4.6	4.0	1960	63	曲	BOX	2019	Ⅱ		3巡目点検			
29	下五ノ坪橋	幹線	國坂江北線	3.2	8.1	2000	23	江北	BOX	2022	Ⅰ					3巡目点検
30	石ケ坪橋	幹線	國坂江北線	2.9	23.1	2000	23	江北	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
31	無名橋１	その他	江北１号線	9.6	6.9	2000	23	江北	PC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
32	第２壱後谷橋	その他	東新田場２号線	2.2	5.0	1979	44	江北	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
33	下荒神橋	その他	江北３号線	7.0	5.0	2000	23	江北	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
34	第１壱後谷橋	その他	江北浜３号線	2.3	5.4	1979	44	江北	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
35	鷺田橋	その他	西新田場１号線	3.2	7.2	1972	51	江北	RC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
36	第１南潮田橋	その他	西新田場２号線	2.2	6.4	1972	51	江北	RC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
37	山下橋	その他	西新田場３号線	2.7	6.4	1972	51	江北	RC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
38	上前田橋１	その他	江北７号線	7.0	9.9	1967	56	江北	BOX	2021	Ⅱ				3巡目点検	
39	下前田橋	その他	江北１２号線	3.2	2.4	1953	70	江北	RC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
40	中前田橋	その他	江北２３号線	3.3	5.1	1953	70	江北	RC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
41	無名橋２	その他	みどり１号線	2.9	11.0	2000	23	江北	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
42	中発原橋	その他	みどり１号線	3.0	9.1	1977	46	江北	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
43	第１駄経寺橋	その他	みどり４号線	2.4	7.7	1974	49	江北	RC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
44	第２駄経寺橋	その他	みどり５号線	2.4	5.3	1974	49	江北	RC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
45	第３駄経寺橋	その他	みどり６号線	2.5	7.6	1977	46	江北	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
46	小包橋	その他	國坂浜１号線	3.0	15.6	1976	47	江北	BOX	2021	Ⅰ				3巡目点検	
47	大昔田橋	その他	國坂浜２号線	4.0	5.4	1976	47	国坂	BOX	2022	Ⅱ					3巡目点検
48	放水路５号橋	幹線	下神國坂浜線	37.2	7.0	2006	17	弓原	PC橋	2020	Ⅱ		3巡目点検			
49	兎野橋	幹線	大野西新田場線	2.7	7.3	1972	51	江北	RC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
50	第３大畑ケ橋	その他	國坂１号線	2.2	5.6	2000	23	国坂	BOX	2022	Ⅱ					3巡目点検
51	上中屋敷橋	その他	國坂浜２号線	2.1	14.9	1988	35	国坂	BOX	2022	Ⅱ					3巡目点検
52	浜辺橋	その他	田井１号線	5.3	4.9	1978	45	田井	PC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
53	田井橋	幹線	田井３号線	5.3	4.8	1979	44	田井	PC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
54	下平田橋	幹線	中央１号線	3.5	6.2	2000	23	国坂	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
55	土居下橋２	幹線	中央１号線	4.4	7.4	2000	23	土下	BOX	2022	Ⅱ					3巡目点検
56	第１大日橋	その他	中央２号線	2.2	6.0	1975	48	田井	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
57	第２大日橋	その他	中央３号線	2.2	6.1	1975	48	田井	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
58	第１前田橋	その他	北尾土下線	4.2	3.3	1974	49	土下	RC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
59	第２前田橋	その他	土下１号線	5.3	8.7	1979	44	土下	RC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
60	丸山橋	その他	土下１２号線	3.6	7.7	2000	23	土下	BOX	2021	Ⅰ				3巡目点検	
61	第2一の崎橋	その他	米里北尾線	2.1	6.5	1960	63	米里	BOX	2020	Ⅰ			3巡目点検		
62	訓脳橋	その他	米里北尾線	2.2	4.9	1960	63	北条島	RC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
63	五ノ鼻橋	その他	米里１０号線	8.8	3.4	1981	42	米里	RC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
64	大町橋	その他	米里１２号線	11.5	4.0	1987	36	米里	RC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
65	三ノ崎橋	その他	米里１４号線	14.6	4.0	2000	23	米里	PC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
66	一の崎橋	その他	米里１７号線	13.0	6.7	2000	23	米里	PC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検

番号	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	所在地	構造形式	最新点検年次	判定区分	対策の内容・時期				
												R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)
67	前町橋	その他	島１号線	12.6	4.1	1971	52	北条島	PC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
68	城ノ内橋	その他	島４号線	11.4	4.7	1972	51	北条島	PC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
69	島橋	その他	島１２号線	12.4	5.9	1954	69	北条島	PC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
70	竹下橋	その他	島１３号線	10.4	3.5	1970	53	北条島	PC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
71	八反田橋	その他	島土下線	13.3	5.0	1992	31	北条島	PC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
72	土下北尾線１号橋	その他	土下北尾線	3.5	5.0	2000	23	土下	BOX	2021	Ⅰ				3巡目点検	
73	北尾新橋	その他	土下北尾線	14.5	6.3	2000	23	北原	PC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
74	灰崎橋１	その他	北尾６号線	5.8	5.6	2006	17	北原	BOX	2021	Ⅰ				3巡目点検	
75	浜川橋１	その他	弓原１号線	5.3	4.5	1978	45	弓原	PC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
76	西沢橋	その他	弓原２号線	3.4	6.1	1975	48	弓原	RC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
77	第１中浜辺橋	その他	弓原２号線	4.0	14.2	1987	36	弓原	BOX	2021	Ⅱ				3巡目点検	
78	竹ケ鼻橋	その他	弓原２号線	11.0	4.1	1965	58	弓原	RC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
79	本町橋	その他	弓原９号線	11.0	5.8	1965	58	下神	PC橋	2022	Ⅰ					3巡目点検
80	松本橋	その他	下神３号線	11.0	5.5	1965	58	下神	RC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
81	円崎橋	その他	下神４号線	11.0	3.0	1954	69	下神	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
82	沖田橋	その他	下神曲線	4.6	3.8	1955	68	曲	BOX	2020	Ⅰ			3巡目点検		
83	赤田橋	その他	松神曲２号線	4.6	4.8	1954	69	曲	BOX	2020	Ⅰ			3巡目点検		
84	大坪橋２	その他	松神曲３号線	5.8	4.8	1957	66	曲	BOX	2020	Ⅰ			3巡目点検		
85	第二屋敷橋	その他	松神１号線	12.7	5.5	2000	23	松神	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
86	放水路３号橋	幹線	弓原松神線	37.2	7.0	2005	18	弓原	PC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
87	第一坂根橋	その他	曲４号線	3.4	4.1	2000	23	曲	RC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
88	第二坂根橋	その他	曲５号線	2.8	6.4	1965	58	曲	RC橋	2021	Ⅱ				3巡目点検	
89	背戸橋	その他	江北３２号線	2.3	8.3	1982	41	江北	RC橋	2022	Ⅰ					3巡目点検
90	下発原橋	その他	みどり１２号線	2.5	8.0	2000	23	江北	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
91	四ノ坪橋	その他	みどり１７号線	2.9	8.4	2000	23	江北	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
92	第一三ノ坪橋	その他	みどり１９号線	3.8	10.0	2000	23	江北	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
93	第二三ノ坪橋	その他	みどり２０号線	3.8	10.0	2000	23	江北	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
94	前田橋１	その他	土下１３号線	4.2	13.1	2000	23	土下	BOX	2022	Ⅲ					3巡目点検
95	稲戸橋	その他	江北３３号線	2.6	8.0	2000	23	江北	BOX	2022	Ⅱ					3巡目点検
96	水つき橋	その他	曲１２号線	3.1	4.0	2000	23	曲	BOX	2021	Ⅰ				3巡目点検	
97	無名橋３	幹線	松神國坂線	2.8	5.1	2000	23	松神	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
98	第二國坂橋	幹線	原道線	4.1	5.0	2000	23	国坂	BOX	2022	Ⅱ					3巡目点検
99	浜川橋２	幹線	松神國坂線	6.3	18.1	1987	36	下神	BOX	2020	Ⅱ			3巡目点検		
100	無名橋５	幹線	松神國坂線	10.9	4.1	2000	23	弓原	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
101	放水路９号橋	幹線	松神國坂線	37.4	5.0	2007	16	弓原	PC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
102	無名橋６	その他	田井大野線	4.8	5.0	2000	23	国坂	BOX	2022	Ⅱ					3巡目点検
103	無名橋７	その他	さくら１号線	3.8	8.2	2000	23	江北	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
104	無名橋８	その他	さくら２号線	3.8	8.2	2000	23	江北	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
105	曲１６号線１号橋	その他	曲１６号線	2.2	12.9	2000	23	曲	BOX	2021	Ⅱ				3巡目点検	
106	土下１６号線１号	その他	土下１６号線	3.6	13.1	2000	23	土下	RC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
107	無名橋９	その他	國坂１５号線	3.0	6.1	1987	36	国坂	BOX	2021	Ⅰ				3巡目点検	
108	無名橋１０	その他	江北浜１６号線	7.4	2.8	1961	62	江北	RC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
109	東浜辺橋	幹線	北条北線	7.1	17.3	1992	31	弓原	BOX	2020	Ⅱ			3巡目点検		
110	北尾橋	幹線	北条西線	14.6	21.1	1978	45	北尾	PC橋	2021	Ⅱ				3巡目点検	
111	放水路７号橋	幹線	放水路左岸線	37.1	5.0	2008	15	弓原	PC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
112	放水路８号橋	幹線	放水路左岸線	37.0	5.0	2007	16	弓原	PC橋	2022	Ⅱ				3巡目点検	
113	放水路４号橋	幹線	放水路左岸線	37.3	7.0	2005	18	弓原	PC橋	2022	Ⅱ				3巡目点検	
114	梶網橋	その他	梶網線	3.6	7.0	1995	28	由良宿	RC橋	2022	Ⅱ				3巡目点検	
115	前川橋	その他	二軒屋裏線	17.9	4.0	1991	32	由良宿	PC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
116	裏門橋	その他	台場線	80.0	4.0	1991	32	由良宿	鋼橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
117	あじさい橋	その他	川端通線	18.0	4.3	2000	23	由良宿	PC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
118	町営住宅東橋	その他	油町通線	2.7	5.6	1987	36	由良宿	RC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
119	二條橋	その他	油町通線	20.6	4.3	1991	32	由良宿	鋼橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
120	上谷川橋	その他	寺町通線	2.5	2.7	1953	70	由良宿	RC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
121	三条橋	その他	寺町通線	14.6	3.7	1935	88	由良宿	RC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
122	日和向橋	その他	日和川通線	4.6	3.2	1940	83	由良宿	RC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
123	思案橋	その他	浜宮町通線	4.3	3.5	1940	83	由良宿	RC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
124	第一とんど橋	その他	田町南線	15.4	3.0	1995	28	由良宿	PC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
125	小橋	その他	揚村通線	7.0	3.3	1978	45	由良宿	RC橋	2021	Ⅱ			3巡目点検		
126	配竹橋	幹線	育英東線	2.9	6.0	1987	36	六尾	BOX	2021	Ⅰ				3巡目点検	
127	停車場橋	幹線	駅前西線	16.4	10.0	1995	28	由良宿	PC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
128	駅南橋	幹線	大栄小中学校線	17.0	10.4	2001	22	由良宿	PC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
129	町営住宅中橋	その他	由良保育所前線	2.4	7.5	1987	36	由良宿	BOX	2020	Ⅰ			3巡目点検		

番号	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	所在地	構造形式	最新点検年次	判定区分	対策の内容・時期				
												R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)
130	立川橋１	その他	由良保育所前線	4.1	5.0	1977	46	由良宿	BOX	2021	Ⅱ				3巡目点検	
131	お台場大橋	幹線	台場南線	139.4	6.0	1980	43	由良宿	PC橋	2021	Ⅱ				3巡目点検	
132	妻波下橋	その他	徳山高見線	2.6	1.0	1967	56	妻波	RC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
133	妻波橋	幹線	妻波青木線	19.9	7.2	1984	39	妻波	PC橋	2021	Ⅱ			3巡目点検		
134	上前田橋２	その他	妻波大谷線	5.0	5.7	1967	56	大谷	BOX	2021	Ⅰ				3巡目点検	
135	西原橋	その他	妻波大谷線	5.1	6.0	1987	36	大谷	BOX	2020	Ⅱ			3巡目点検		
136	下上谷橋	その他	妻波南大谷線	3.5	5.8	1977	46	妻波	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
137	大谷東橋	幹線	大谷青木線	16.6	6.0	1983	40	大谷	PC橋	2021	Ⅱ				3巡目点検	
138	番ノ木橋	幹線	大谷青木線	20.6	7.2	1979	44	大谷	PC橋	2021	Ⅲ			3巡目点検		
139	新堤下橋	幹線	比山大谷南線	3.4	6.0	1979	44	妻波	RC橋	2022	Ⅰ					3巡目点検
140	井上橋	その他	妻波ｽｶﾓ塚線	19.9	7.2	1984	39	妻波	PC橋	2021	Ⅱ			3巡目点検		
141	高江大谷第２号橋	その他	高江大谷線	2.0	6.0	1977	46	由良宿	BOX	2021	Ⅱ				3巡目点検	
142	高江大谷第１号橋	その他	高江大谷線	6.8	7.0	1961	62	由良宿	PC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
143	前田橋２	幹線	大谷新川桜池線	4.9	11.9	1977	46	大谷	BOX	2021	Ⅱ				3巡目点検	
144	塚畑橋	幹線	大谷新川桜池線	19.9	7.2	1983	40	大谷	PC橋	2021	Ⅱ			3巡目点検		
145	原田橋	その他	神楽田道線	2.5	4.9	1987	36	瀬戸	RC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
146	前田下橋	その他	六尾配竹南線	3.3	3.3	1977	46	六尾	RC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
147	西穂波橋	幹線	干目西穂波線	8.7	7.7	1977	46	六尾	PC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
148	六尾橋	幹線	六尾通り線	3.6	6.0	1979	44	六尾	BOX	2022	Ⅰ					3巡目点検
149	前田橋３	幹線	六尾通り線	3.2	5.1	1977	46	六尾	RC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
150	六尾東沖橋	幹線	六尾通り線	2.2	5.0	1977	46	六尾	RC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
151	永代橋	その他	子守神社道線	3.4	4.2	1977	46	六尾	RC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
152	宮下橋	その他	瀬戸神社道線	30.5	4.0	1977	46	瀬戸	鋼橋	2021	Ⅱ				3巡目点検	
153	森光橋	その他	西園道線	6.7	4.0	1987	36	西園	BOX	2021	Ⅰ				3巡目点検	
154	西園橋	幹線	西園村中道線	9.6	6.6	1969	54	西園	RC橋	2021	Ⅰ			3巡目点検		
155	一本橋	その他	西園村中道線	11.8	3.0	1961	62	西園	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
156	西園中橋	その他	西園村中道線	11.8	3.0	1961	62	西園	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
157	黒川橋	幹線	東園学利道線	3.2	23.8	1987	36	東園	RC橋	2021	Ⅰ			3巡目点検		
158	東園横良１号橋	幹線	東園学利道線	6.8	7.5	1987	36	東園	BOX	2021	Ⅱ			3巡目点検		
159	西橋	その他	東園村中道線	12.1	5.0	1979	44	東園	PC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
160	原1号橋	幹線	原道線	2.7	5.3	1987	36	東園	RC橋	2020	Ⅰ			3巡目点検		
161	原２号橋	幹線	原道線	5.6	6.2	1987	36	東園	BOX	2020	Ⅱ			3巡目点検		
162	加賀前橋	その他	大川道線	29.5	2.3	1969	54	瀬戸	鋼橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
163	亀尻橋	幹線	亀尻道線	2.6	17.6	1953	70	瀬戸	RC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
164	東園中橋	幹線	大網道線	10.9	4.0	1940	83	東園	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
165	西園横良１号橋	幹線	西園学利道線	6.7	4.0	1968	55	西園	BOX	2021	Ⅰ				3巡目点検	
166	鶴喰橋	その他	西園瀬戸線	6.7	6.2	1987	36	西園	BOX	2021	Ⅰ				3巡目点検	
167	東園原第１号橋	その他	東園原第１号線	3.0	4.4	1955	68	東園	RC橋	2021	Ⅱ			3巡目点検		
168	東園原第２号橋	その他	東園原第１号線	5.6	4.0	1987	36	東園	BOX	2021	Ⅰ				3巡目点検	
169	四反田橋	その他	東園原第２号線	3.1	4.9	1987	36	東園	RC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
170	宮光橋	その他	東園原第２号線	5.6	4.0	1987	36	東園	BOX	2021	Ⅰ				3巡目点検	
171	西の橋	その他	西園国道線	11.8	4.1	1957	66	西園	RC橋	2019	Ⅲ		3巡目点検			
172	松垣橋	その他	下種今在家線	18.4	4.0	1970	53	下種	RC橋	2019	Ⅲ		3巡目点検			
173	野田橋	幹線	岩坪今在家線	2.6	7.1	1977	46	岩坪	BOX	2021	Ⅱ				3巡目点検	
174	大橋	幹線	岩坪今在家線	21.0	3.0	1971	52	下種	鋼橋	2022	Ⅰ					3巡目点検
175	垣ノ内橋	その他	上種垣内線	12.6	4.0	1977	46	上種	RC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
176	陽な場橋	その他	東屋敷西屋敷線	11.0	4.0	1961	62	上種	PC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
177	東高尾橋	幹線	上種東高尾線	18.9	6.5	1992	31	西高尾	PC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
178	前田橋４	その他	亀谷向屋敷線	5.1	3.4	1977	46	亀谷	RC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
179	下坂前橋	その他	亀谷向屋敷線	7.0	4.0	1961	62	亀谷	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
180	貝谷橋	その他	西高尾東高尾線	4.7	2.9	1959	64	西高尾	RC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
181	宮橋	その他	西高尾東高尾線	8.4	4.8	1972	51	西高尾	PC橋	2021	Ⅱ			3巡目点検		
182	西園新橋	その他	西園旧国道線	19.5	4.0	2000	23	西園	PC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
183	由良停車場橋	その他	由良関金線	5.4	6.3	1955	68	由良宿	BOX	2019	Ⅱ		3巡目点検			
184	岩井神橋	その他	観音谷岩井神線	3.4	8.8	1987	36	亀谷	RC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
185	東園神社東橋	その他	東園日本隠線	12.9	11.0	1999	24	東園	PC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
186	前新田橋	その他	島明り隈西穂波線	3.0	6.0	1987	36	西穂波	RC橋	2020	Ⅲ			3巡目点検		
187	大隈橋	その他	島明り隈西穂波線	22.4	4.0	1971	52	大島	鋼橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
188	池畷西橋	その他	島北縦貫線	3.8	5.0	1987	36	大島	RC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
189	大隈小橋	その他	島中橋山鼻線	3.4	6.0	1977	46	西穂波	RC橋	2020	Ⅲ			3巡目点検		
190	中島橋	その他	島中橋山鼻線	17.6	4.0	1984	39	西穂波	PC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			

番号	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	所在地	構造形式	最新点検年次	判定区分	対策の内容・時期				
												R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)
191	金毛小橋	その他	島日焼金毛線	3.2	5.6	1977	46	大島	RC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
192	北磯畷ノ橋	その他	島日焼金毛線	3.8	4.6	1987	36	大島	RC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
193	金毛橋	その他	島日焼金毛線	22.3	4.0	1971	52	大島	鋼橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
194	新宮橋	幹線	東高尾西高尾線	9.4	7.9	1985	38	西高尾	PC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
195	駅南歩道橋	その他	ハトマ南線	35.3	1.5	1975	48	由良宿	鋼橋	2020	Ⅱ		3巡目点検			
196	東園東橋	幹線	東園工場団地線	10.9	4.0	1961	62	東園	RC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
197	東亀谷橋	その他	東亀谷津原線	16.4	4.0	1970	53	亀谷	鋼橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
198	瀬戸橋	幹線	瀬戸橋線	32.4	5.6	2015	8	瀬戸	PC橋	2020	Ⅱ		3巡目点検			
199	上坂橋	その他	東高尾上坂線	9.5	4.8	1961	62	東高尾	PC橋	2020	Ⅱ			3巡目点検		
200	下坂橋	その他	東高尾下坂線	13.5	5.0	1961	62	東高尾	PC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
201	駅西歩道橋	幹線	由良別所線	72.9	3.4	1984	39	由良宿	鋼橋	2021	Ⅱ			3巡目点検		
202	船磯橋	その他	六尾南・西穂波線	3.4	5.0	1987	36	六尾	RC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
203	原南橋	その他	原南線	2.7	5.5	1987	36	原	RC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
204	二軒屋橋	その他	六尾大谷線	3.0	6.0	1962	61	由良宿	RC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
205	大谷橋	幹線	六尾大谷線	2.6	5.6	1977	46	妻波	BOX	2021	Ⅱ				3巡目点検	
206	大谷西橋	幹線	六尾大谷線	3.0	16.6	1977	46	大谷	BOX	2021	Ⅱ				3巡目点検	
207	立川橋２	幹線	六尾大谷線	4.0	9.3	1977	46	由良宿	BOX	2021	Ⅱ				3巡目点検	
208	新川橋	その他	六尾大谷線	4.9	15.6	1977	46	大谷	BOX	2021	Ⅱ				3巡目点検	
209	由良橋	その他	六尾大谷線	7.6	17.2	1991	32	由良宿	BOX	2021	Ⅱ			3巡目点検		
210	町中橋	その他	六尾大谷線	15.2	6.0	1993	30	由良宿	PC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
211	中橋	幹線	亀谷中橋線	17.6	9.2	1993	30	大島	PC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
212	寺橋	その他	西高尾向ヒ田線	9.5	4.0	1961	62	西高尾	RC橋	2021	Ⅰ				3巡目点検	
213	二号無名橋	その他	旧杉下倉吉線	2.6	4.0	1967	56	西高尾	RC橋	2021	Ⅱ			3巡目点検		
214	用水橋	その他	旧法万大栄線	3.6	4.5	1967	56	西高尾	RC橋	2019	Ⅱ		3巡目点検			
215	大谷前川尻橋	その他	大谷９号側道線	4.1	4.2	2000	23	大谷	BOX	2021	Ⅰ				3巡目点検	
216	新座川尻橋	その他	大谷９号側道線	4.5	4.0	1977	46	大谷	BOX	2021	Ⅱ				3巡目点検	
217	高江橋	幹線	由良別所線	16.5	7.0	1998	25	由良宿	RC橋	2022	Ⅱ					3巡目点検
合　計　（千円）												60,051	19,949	6,604	2,145	19,566

対策年	R5（2023）		R6（2024）		R7（2025）		R8（2026）		R9（2027）	
修繕橋梁	No.	橋梁名	No.	橋梁名	No.	橋梁名	No.	橋梁名	No.	橋梁名
	195	駅南歩道橋	186	前新田橋	94	前田橋1	115	前川橋	163	亀尻橋
	100	無名橋5	189	大隈小橋					133	妻波橋
	8	放水路6号橋							140	井上橋
	26	島沢橋							144	塚畑橋
	171	西の橋							78	竹ケ鼻橋
	196	東園東橋							121	三条橋
	172	松垣橋							147	西穂波橋

赤文字：損傷Ⅲの橋梁

【資料Ⅲ】各橋梁の対策内容と対策費用

対策年　令和5年（2023年）

195_駅南歩道橋　　健全度　Ⅱ　　【点検年月：令和2年1月】

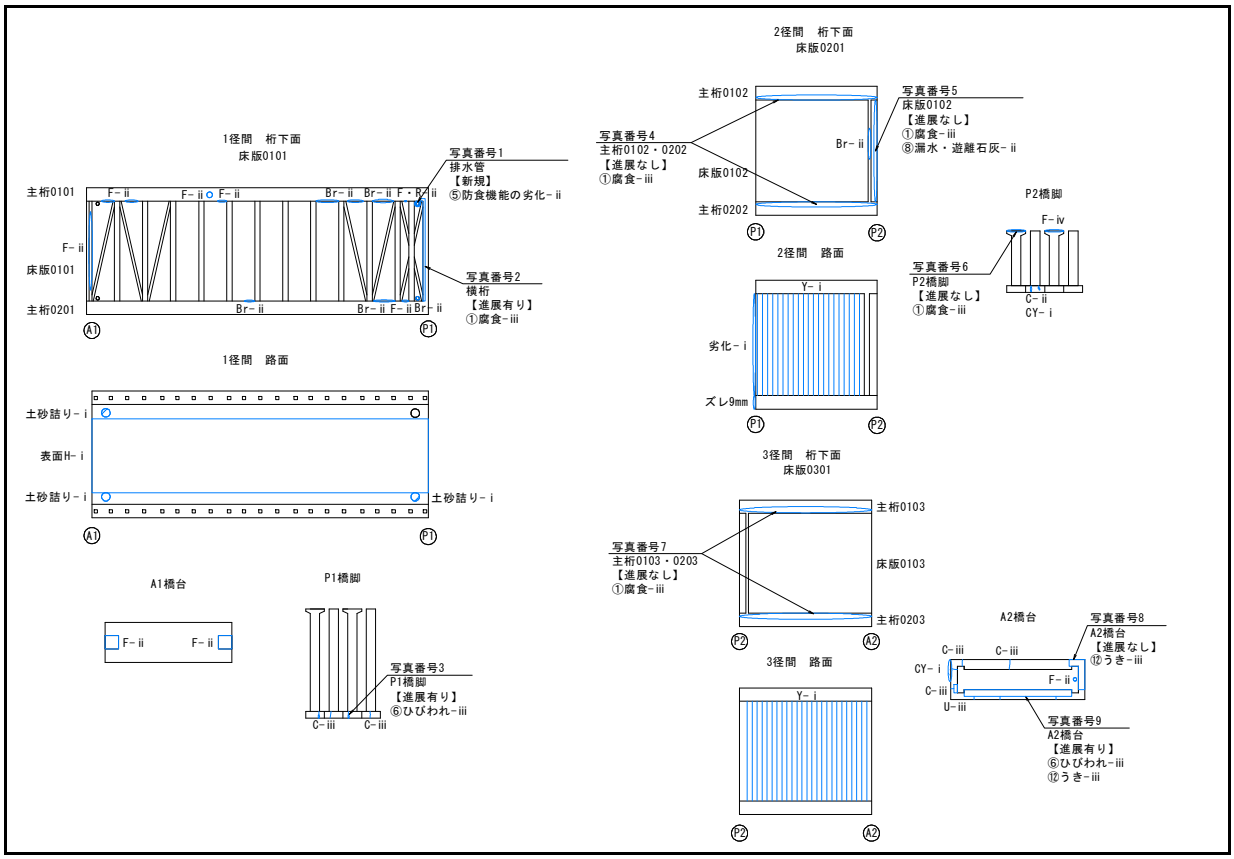

【諸元】

架設年次	橋長	幅員
1975年	35.30m	1.90m
橋梁形式		
H形鋼橋、小橋台、鋼製橋脚		

【損傷概要】

横桁、橋脚梁部に局部的な腐食による板厚減少、P1橋脚、A2橋台のコンクリート部にひびわれが発生している。

概算工事費（諸経費込み）

項目		単価	単位	補修数量	補修費(千円)	
主桁・床版	鋼材再塗装(RC-Ⅲ)	5.5	m^2	300	1,650	
	ひび割れ注入	14	m	0	0	
	断面修復	2478	m^3	0	0	
	表面保護	6	m^2	0	0	
	吊り足場	4.2	m^2	0	0	
	計				**1,650**	
橋台・橋脚	ひび割れ注入	14	m	1.5	21	(P1)
				0.2	3	(P2)
				0.9	13	(A2)
	断面修復	2478	m^3	0	0	
	表面保護	6	m^2	0	0	
	枠組足場	2	m^2	0	0	
	計				**36**	
橋面防水・舗装打ち替え		6	m^2	0	**0**	
伸縮装置止水工		100	m	0	**0**	

補修費　1686（千円）

5割増補修費　2530

補修費						2,530
共通仮設費						691
共通仮設費（率計上）	橋梁保全工事　地方部影響なし	式			27.32	691
純工事費		式	1			3,221
現場管理費	橋梁保全工事　地方部影響なし	式	1		64.97	2,092
工事原価		式	1			5,313
一般管理費		式	1		22.72	1,207
工事価格		式	1			6,520

合計　**6,520**（千円）

対策年　令和5年（2023年）

100_無名橋５　　健全度　Ⅱ　　【点検年月：令和４年10月】

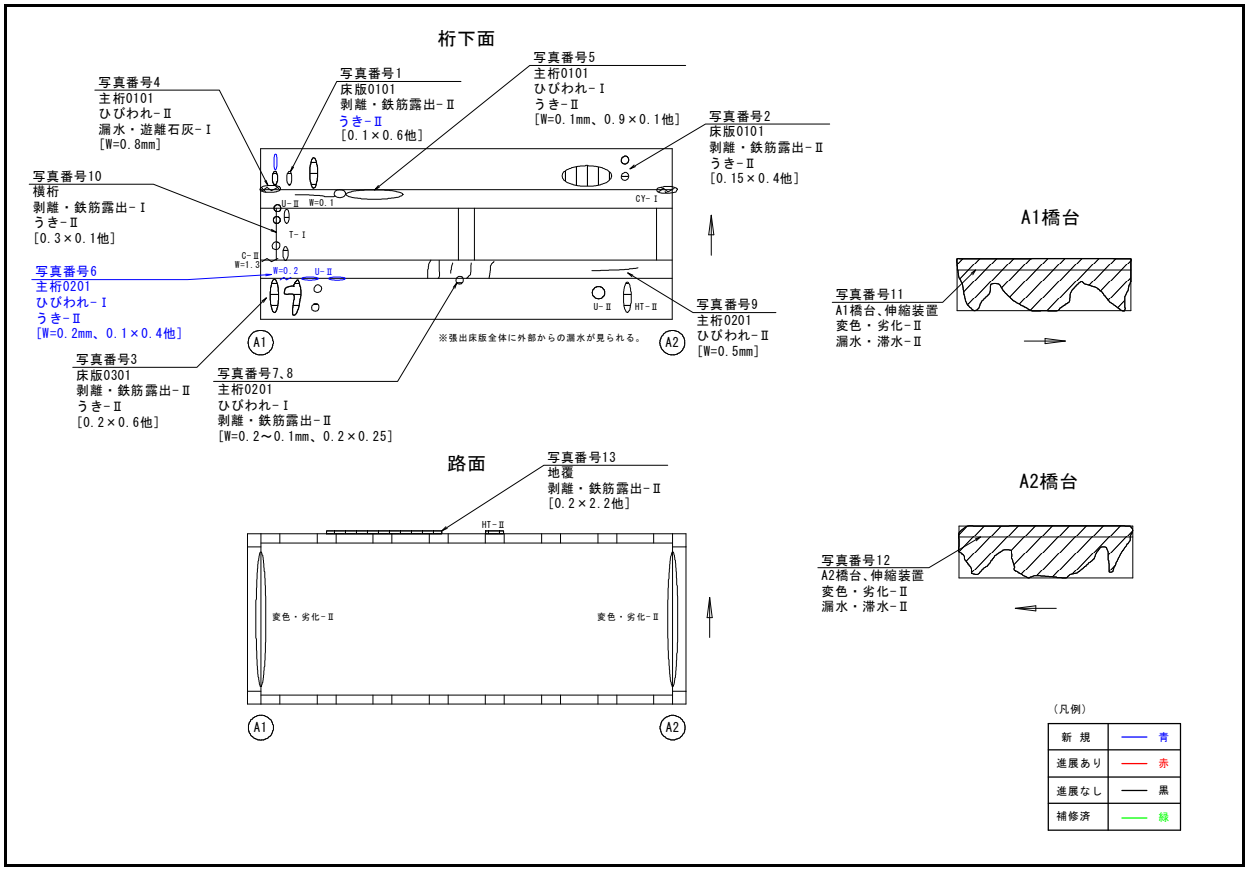

【諸元】

架設年次	橋長	幅員
2000年	10.9m	4.6m
橋梁形式		
RCT桁橋、重力式橋台		

【損傷概要】

床版、主桁にかぶり不足と思われる剥離･鉄筋露出､うきが点在している。

概算工事費（諸経費込み）

項目		単価	単位	補修数量	補修費(千円)
主桁・床版	ひび割れ注入	14	m	6.5	91
	断面修復	2478	m^3	0.5	1,239
	表面保護	6	m^2	7.0	42
	吊り足場	4.2	m^2	0	0
	計				**1,372**
橋台	ひび割れ注入	14	m	0	0
	断面修復	2478	m^3	0	0
	表面保護	6	m^2	0	0
	枠組足場	2	m^2	0	0
	計				**0**
橋面防水・舗装打ち替え		6	m^2	0	**0**
弾性シール材充填		50	m	8.2	**410**

補修費　1782（千円）

5割増補修費　2673

補修費						2,673
共通仮設費						730
共通仮設費（率計上）	橋梁保全工事　地方部影響なし	式			27.32	730
純工事費		式	1			3,403
現場管理費	橋梁保全工事　地方部影響なし	式	1		64.97	2,211
工事原価		式	1			5,614
一般管理費		式	1		22.72	1,276
工事価格		式	1			6,890

合計　**6,890**（千円）

対策年　令和5年（2023年）

8_ 放水路６号橋　　健全度　Ⅲ　　【点検年月日：令和３年６月】

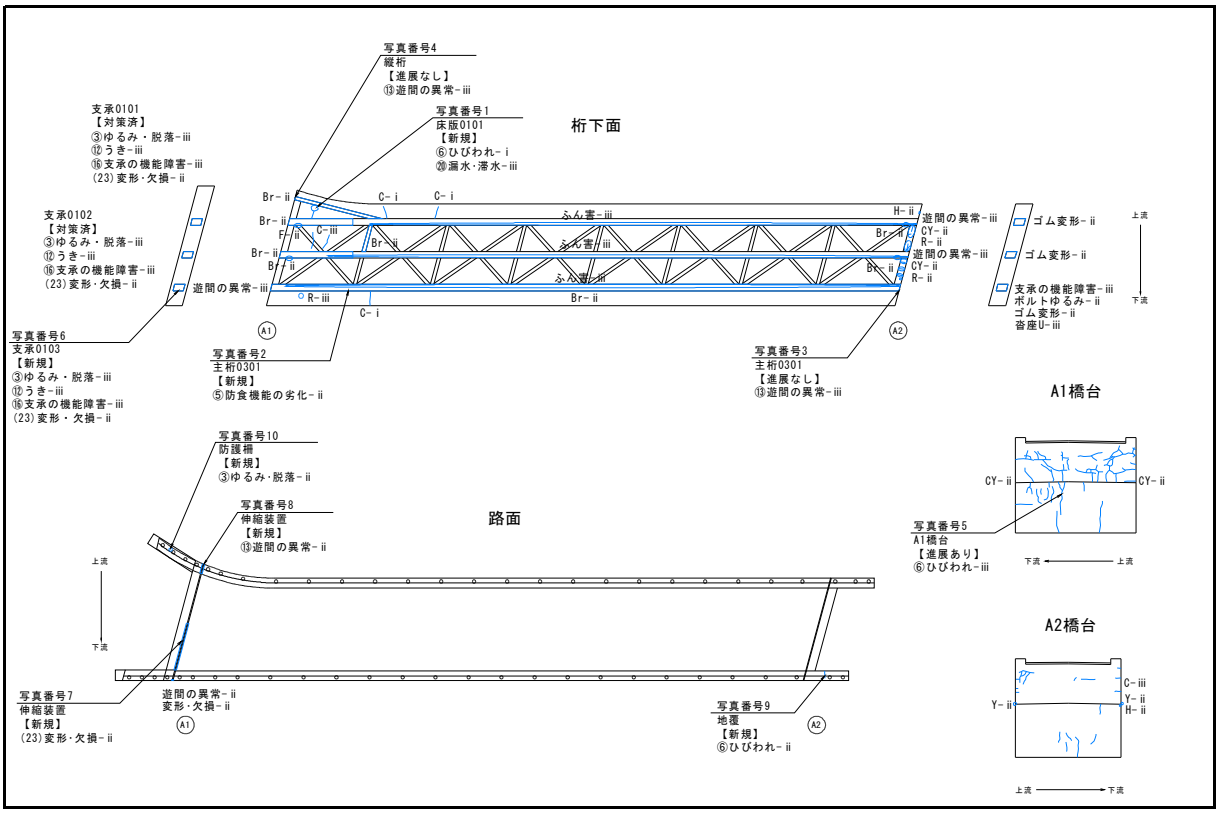

【諸元】

架設年次	橋長	幅員
2007年	38.4m	6.2m
橋梁形式		
鋼I桁橋、逆T式橋台		

【損傷概要】

支承にゴムの変形、ボルトの脱落、沓座のうきが発生している。主桁･縦桁の端部がパラペットに接触している。

概算工事費（諸経費込み）

項目		単価	単位	補修数量	補修費(千円)	
主桁・床版	鋼材再塗装(RC-Ⅲ)	5.5	m^2	34.56	190	
	ひび割れ注入	14	m	0	0	
	断面修復	2478	m^3	0	0	
	表面保護	6	m^2	0	0	
	吊り足場	4.2	m^2	0	0	
	計				**190**	
橋台	ひび割れ注入	14	m	15.7	220	(A1)
				3.65	51	(A2)
	断面修復	2478	m^3	0	0	
	表面保護	6	m^2	0	0	
	枠組足場	2	m^2	0	0	
	計				**271**	
橋面防水・舗装打ち替え		6	m^2	0	**0**	
伸縮装置止水工		100	m	0	**0**	

補修費　461（千円）

5割増補修費　691

補修費						691
共通仮設費						189
共通仮設費（率計上）	橋梁保全工事　地方部影響なし	式			27.32	189
純工事費		式	1			880
現場管理費	橋梁保全工事　地方部影響なし	式	1		64.97	572
工事原価		式	1			1,452
一般管理費		式	1		22.72	330
工事価格		式	1			1,782

合計　**1,782**（千円）

対策年　令和5年（2023年）

26_島沢橋　　健全度　Ⅱ　　【点検年月日：令和元年12月】

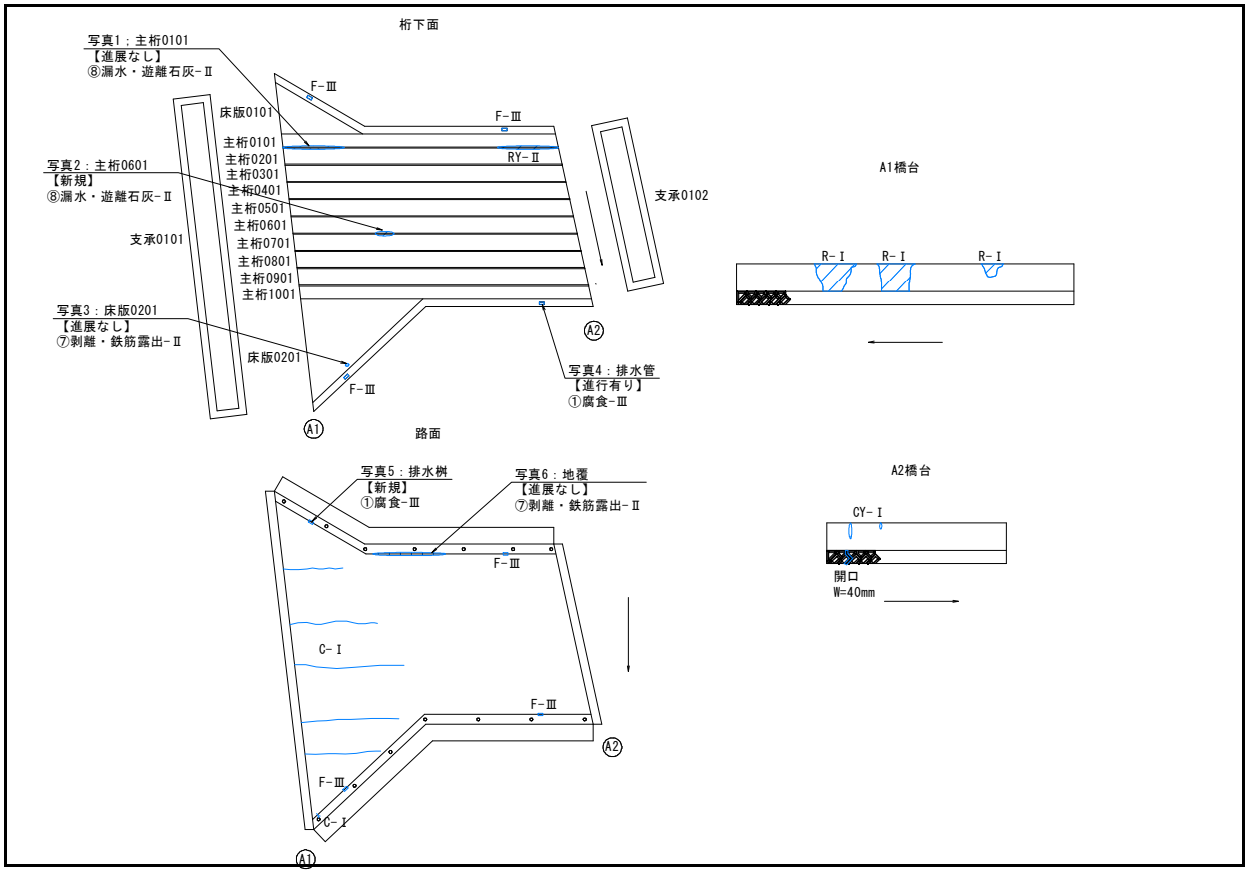

【諸元】

架設年次	橋長	幅員
1977年	11.35m	7.30m
橋梁形式		
PC床版橋、重力式橋台		

【損傷概要】

床版に小規模な鉄筋露出、間詰部から漏水・遊離石灰が見られる。

概算工事費（諸経費込み）

項目		単価	単位	補修数量	補修費(千円)
主桁・床版	ひび割れ注入	14	m	25.8	361
	断面修復	2478	m^3	0.2	496
	表面保護	6	m^2	0	0
	吊り足場	4.2	m^2	0	0
	計				**857**
橋台	ひび割れ注入	14	m	0	0
	断面修復	2478	m^3	0	0
	表面保護	6	m^2	0	0
	枠組足場	2	m^2	0	0
	計				**0**
橋面防水・舗装打ち替え		6	m^2	0	**0**
弾性シール材充填		50	m	0	**0**

補修費　857（千円）

5割増補修費　1285

補修費						1,285
共通仮設費						351
共通仮設費（率計上）	橋梁保全工事　地方部影響なし	式			27.32	351
純工事費		式	1			1,636
現場管理費	橋梁保全工事　地方部影響なし	式	1		64.97	1,063
工事原価		式	1			2,699
一般管理費		式	1		22.72	613
工事価格		式	1			3,312

合計　**3,312**（千円）

対策年　令和5年（2023年）

171_西の橋　　健全度　Ⅲ　　【点検年月：令和元年12月】

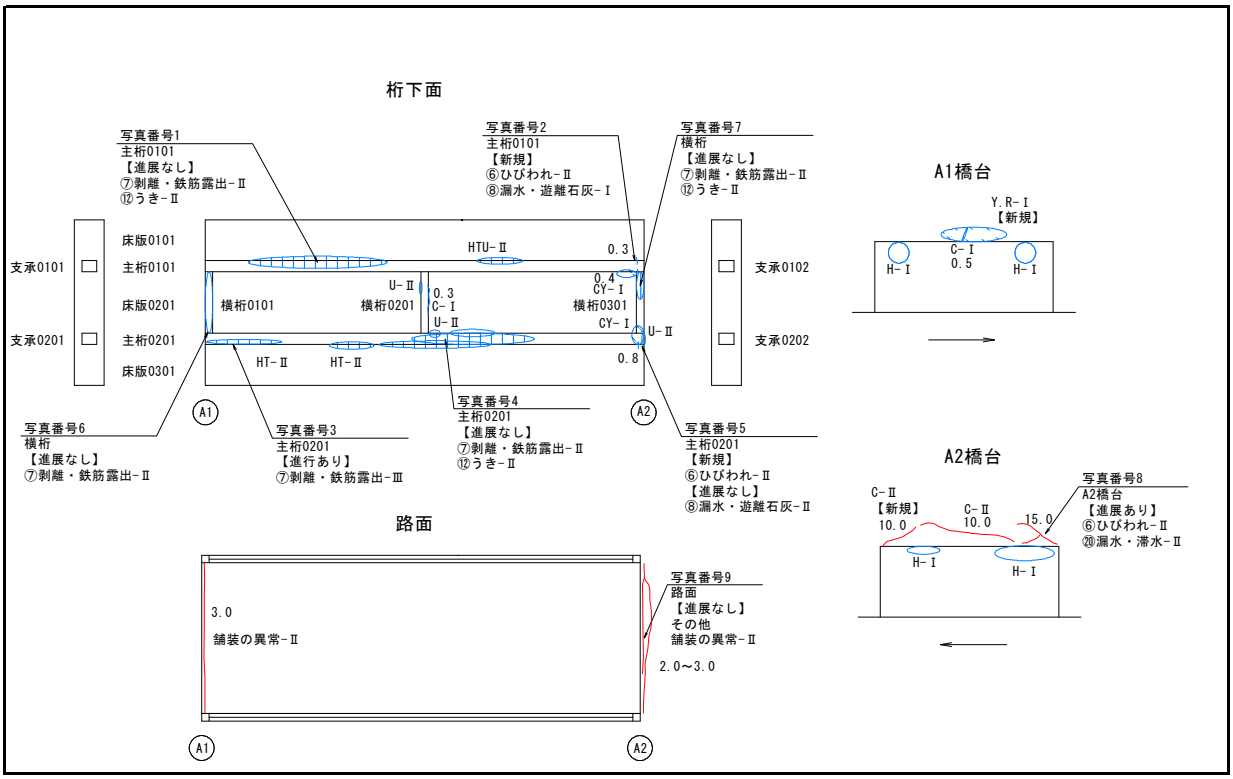

【諸元】

架設年次	橋長	幅員
1957年	11.80m	4.65m
橋梁形式		
RCT桁橋、重力式橋台		

【損傷概要】

主桁にかぶり不足によるうき、剥離・鉄筋露出が広範囲に発生しており、一部主筋が露出している。

概算工事費（諸経費込み）

項目		単価	単位	補修数量	補修費(千円)	
主桁・床版	ひび割れ注入	14	m	0	0	
	断面修復	2478	m^3	0.30	743	
	表面保護	6	m^2	86.5	519	
	吊り足場	4.2	m^2	54.9	231	
	計				**1,493**	
橋台	ひび割れ注入	14	m	5.3	74	(A2)
	断面修復	2478	m^3	0.055	1	(A1)
				0.016	40	(A2)
	表面保護	6	m^2	0	0	
	枠組足場	2	m^2	0	0	
	計				**115**	
橋面防水・舗装打ち替え		6	m^2	0	**0**	
弾性シール材充填		50	m	0	**0**	

補修費　1608（千円）

5割増補修費　2411

補修費						2,411
共通仮設費						659
共通仮設費（率計上）	橋梁保全工事　地方部影響なし	式			27.32	659
純工事費		式	1			3,070
現場管理費	橋梁保全工事　地方部影響なし	式	1		64.97	1,995
工事原価		式	1			5,065
一般管理費		式	1		22.72	1,151
工事価格		式	1			6,216

合計　**6,216**（千円）

対策年　令和5年（2023年）

196_東園東橋　　健全度　Ⅱ　　【点検年月：令和元年12月】

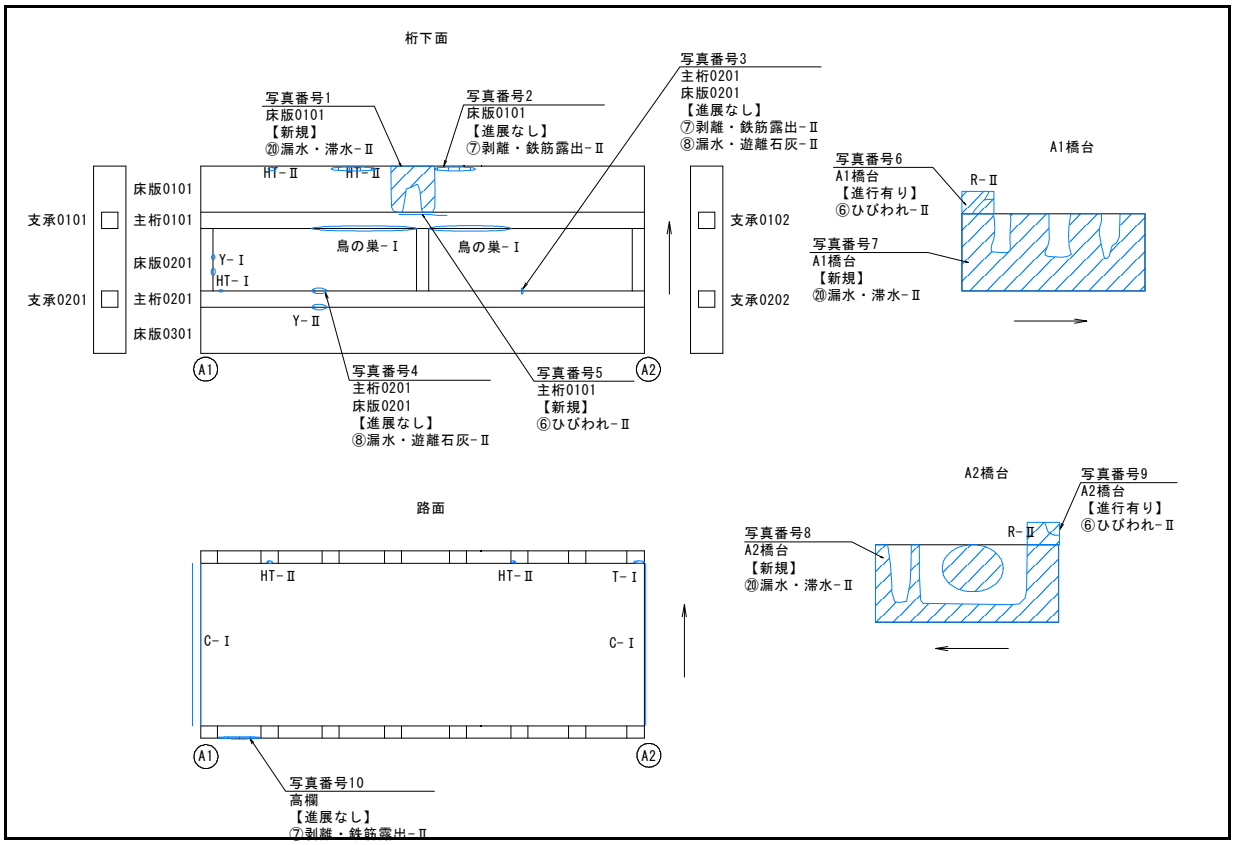

【諸元】

架設年次	橋長	幅員
不明	10.90m	4.50m
橋梁形式		
RCT桁橋、重力式橋台		

【損傷概要】

A2橋台胸壁にひびわれ（W=0.3㎜～1.5㎜）、新たに漏水が見られる。胸壁のひびわれは前回点検時より進行が認められる。

概算工事費（諸経費込み）

項目		単価	単位	補修数量	補修費(千円)
主桁・床版	ひび割れ注入	14	m	1.2	17
	断面修復	2478	m^3	0.2	496
	表面保護	6	m^2	0	0
	吊り足場	4.2	m^2	0	0
	計				**512**
橋台	ひび割れ注入	14	m	0.9	13 (A1)
				0.5	7 (A2)
	断面修復	2478	m^3	0	0
	表面保護	6	m^2	0	0
	枠組足場	2	m^2	0	0
	計				**20**
橋面防水・舗装打ち替え		6	m^2	0	**0**
弾性シール材充填		50	m	8.0	**400**

補修費　932（千円）

5割増補修費　1398

補修費						1,398
共通仮設費						382
共通仮設費（率計上）	橋梁保全工事　地方部影響なし	式			27.32	382
純工事費		式	1			1,780
現場管理費	橋梁保全工事　地方部影響なし	式	1		64.97	1,156
工事原価		式	1			2,936
一般管理費		式	1		22.72	667
工事価格		式	1			3,603

合計　**3,603**（千円）

対策年　令和5年（2023年）

172_松垣橋　　健全度　Ⅲ　　【点検年月：令和元年12月】

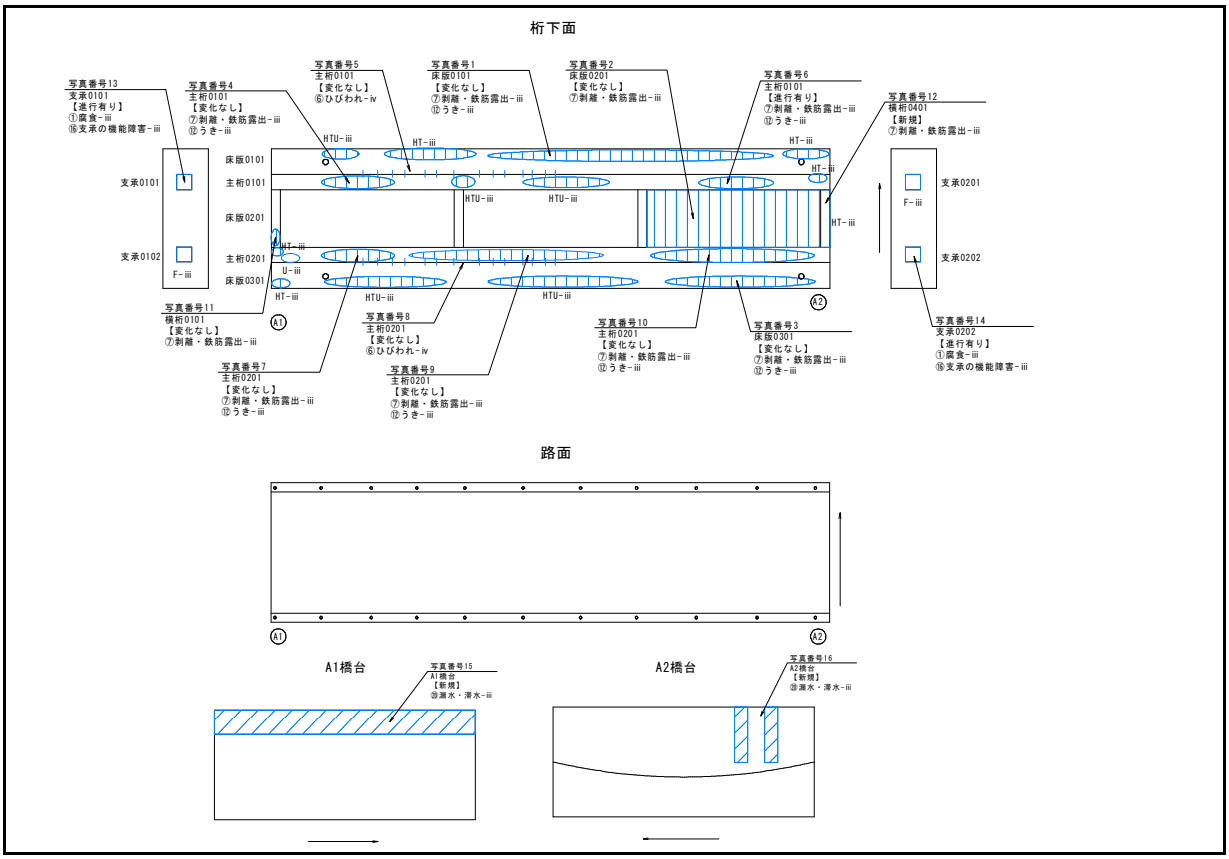

【諸元】

架設年次	橋長	幅員
1970年	18.40m	4.60m
橋梁形式		
RCT桁橋、重力式橋台		

【損傷概要】

主桁側面にW=0.1㎜～0.4㎜の鉛直方向の影響の大きいひびわれ、主桁下面の広範囲にうき、鉄筋露出が発生している。

概算工事費（諸経費込み）

項目		単価	単位	補修数量	補修費(千円)
主桁・床版	ひび割れ注入	14	m	25	350
	断面修復	2478	m^3	2.5	6,195
	表面保護	6	m^2	150.9	905
	吊り足場	4.2	m^2	84.6	355
	計				**7,806**
橋台	ひび割れ注入	14	m	0	0
	断面修復	2478	m^3	0	0
	表面保護	6	m^2	0	0
	枠組足場	2	m^2	0	0
	計				**0**
橋面防水・舗装打ち替え		6	m^2	0	**0**
弾性シール材充填		50	m	8	**400**

補修費　8206（千円）

5割増補修費　12309

補修費						12,309
共通仮設費						3,363
共通仮設費（率計上）	橋梁保全工事　地方部影響なし	式			27.32	3,363
純工事費		式	1			15,672
現場管理費	橋梁保全工事　地方部影響なし	式	1		64.97	10,182
工事原価		式	1			25,854
一般管理費		式	1		22.72	5,874
工事価格		式	1			31,728

合計　**31,728**（千円）

対策年　令和6年（2024年）

186_前新田橋　　健全度　Ⅲ　　【点検年月：令和2年12月】

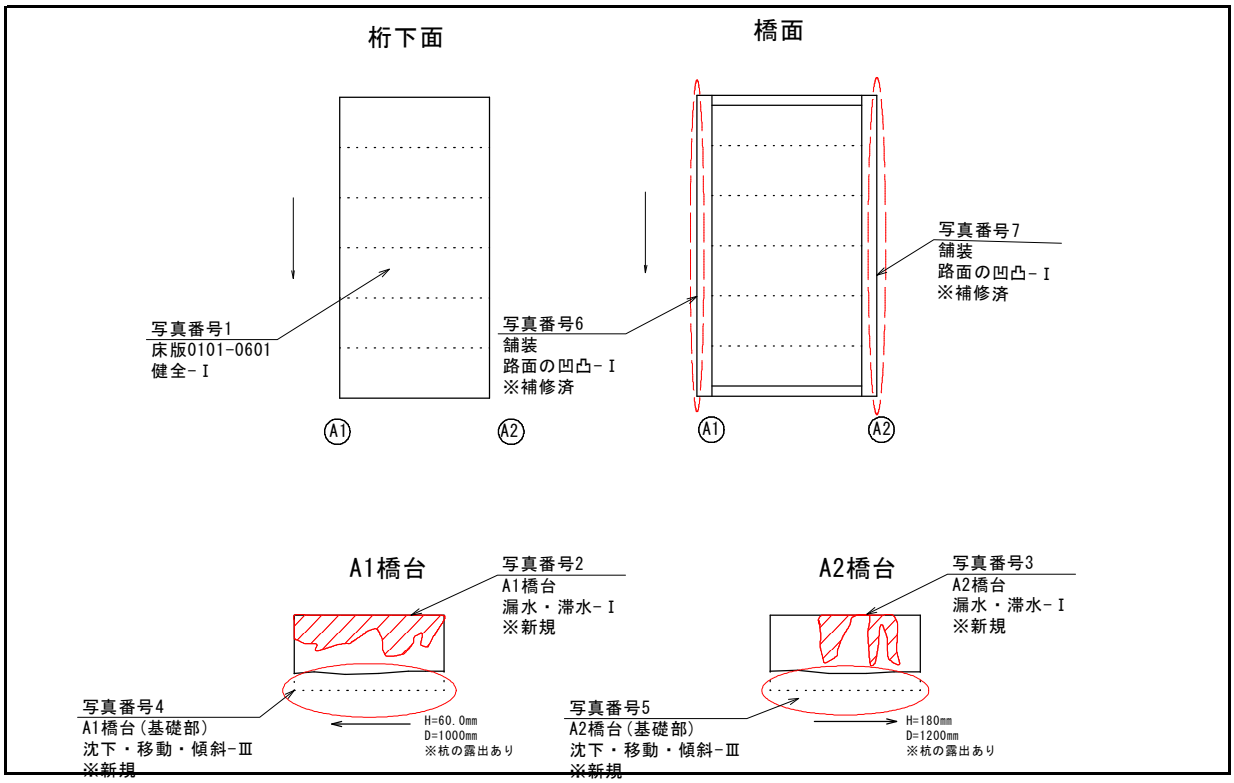

【諸元】

架設年次	橋長	幅員
不明	3.00m	6.00m
橋梁形式		
プレキャスト床版橋、重力式橋台		

【損傷概要】

堅壁に伸縮装置からの漏水が見られる。また基礎部に地盤の沈下が見られ、杭の露出を確認した。

概算工事費（諸経費込み）

項目		単価	単位	補修数量	補修費(千円)
主桁・床版	ひび割れ注入	14	m	0	0
	断面修復	2478	m^3	0	0
	表面保護	6	m^2	0	0
	吊り足場	4.2	m^2	0	0
	計				**0**
橋台	ひび割れ注入	14	m	0	0
	断面修復	2478	m^3	0	0
	表面保護	6	m^2	0	0
	枠組足場	2	m^2	0	0
	基礎杭補修	-			1,000 (A1)
		-			1,000 (A2)
	計				**2,000**
橋面防水・舗装打ち替え		6	m^2	0	**0**
弾性シール材充填		50	m	11.2	**560**

補修費　2560（千円）

5割増補修費　3840

補修費						3,840
共通仮設費						1,049
共通仮設費（率計上）	橋梁保全工事　地方部影響なし	式			27.32	1,049
純工事費		式	1			4,889
現場管理費	橋梁保全工事　地方部影響なし	式	1		64.97	3,176
工事原価		式	1			8,065
一般管理費		式	1		22.72	1,832
工事価格		式	1			9,897

合計　**9,897**（千円）

対策年　令和6年（2024年）

189_大隈小橋　　健全度　Ⅲ　　【点検年月：令和2年12月】

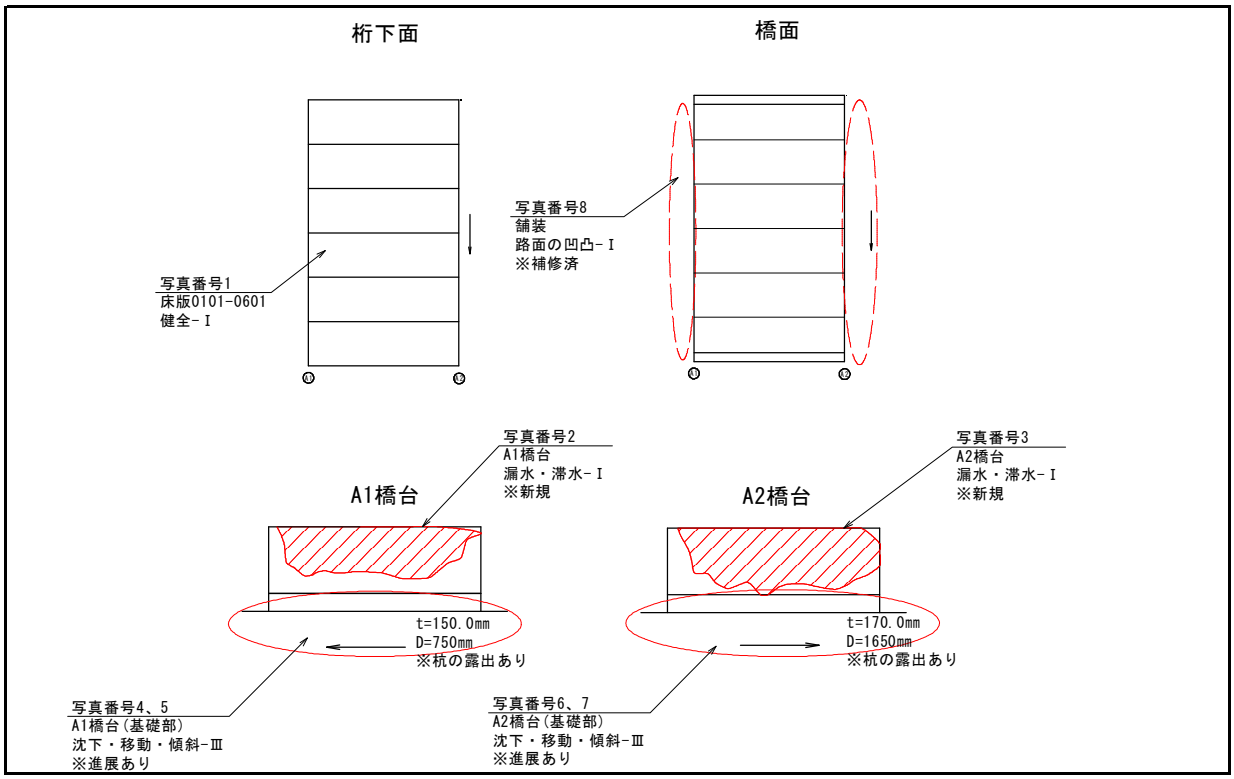

【諸元】

架設年次	橋長	幅員
不明	3.40m	6.00m
橋梁形式		
プレキャスト床版橋、重力式橋台		

【損傷概要】

堅壁に伸縮装置からの漏水が見られる。また基礎部に地盤の沈下が見られ、杭の露出を確認した。

概算工事費（諸経費込み）

項目		単価	単位	補修数量	補修費(千円)
主桁・床版	ひび割れ注入	14	m	0	0
	断面修復	2478	m^3	0	0
	表面保護	6	m^2	0	0
	吊り足場	4.2	m^2	0	0
	計				**0**
橋台	ひび割れ注入	14	m	0	0
	断面修復	2478	m^3	0	0
	表面保護	6	m^2	0	0
	枠組足場	2	m^2	0	0
	基礎杭補修	―			1,000 (A1)
		―			1,000 (A2)
	計				**2,000**
橋面防水・舗装打ち替え		6	m^2	0	**0**
弾性シール材充填		50	m	12	**600**

補修費　2600（千円）

5割増補修費　3900

補修費						3,900
共通仮設費						1,065
共通仮設費（率計上）	橋梁保全工事　地方部影響なし	式			27.32	1,065
純工事費		式	1			4,965
現場管理費	橋梁保全工事　地方部影響なし	式	1		64.97	3,226
工事原価		式	1			8,191
一般管理費		式	1		22.72	1,861
工事価格		式	1			10,052

合計　**10,052**（千円）

対策年　令和7年（2025年）

94_前田橋１　　健全度　Ⅲ　　【点検年月：令和４年８月】

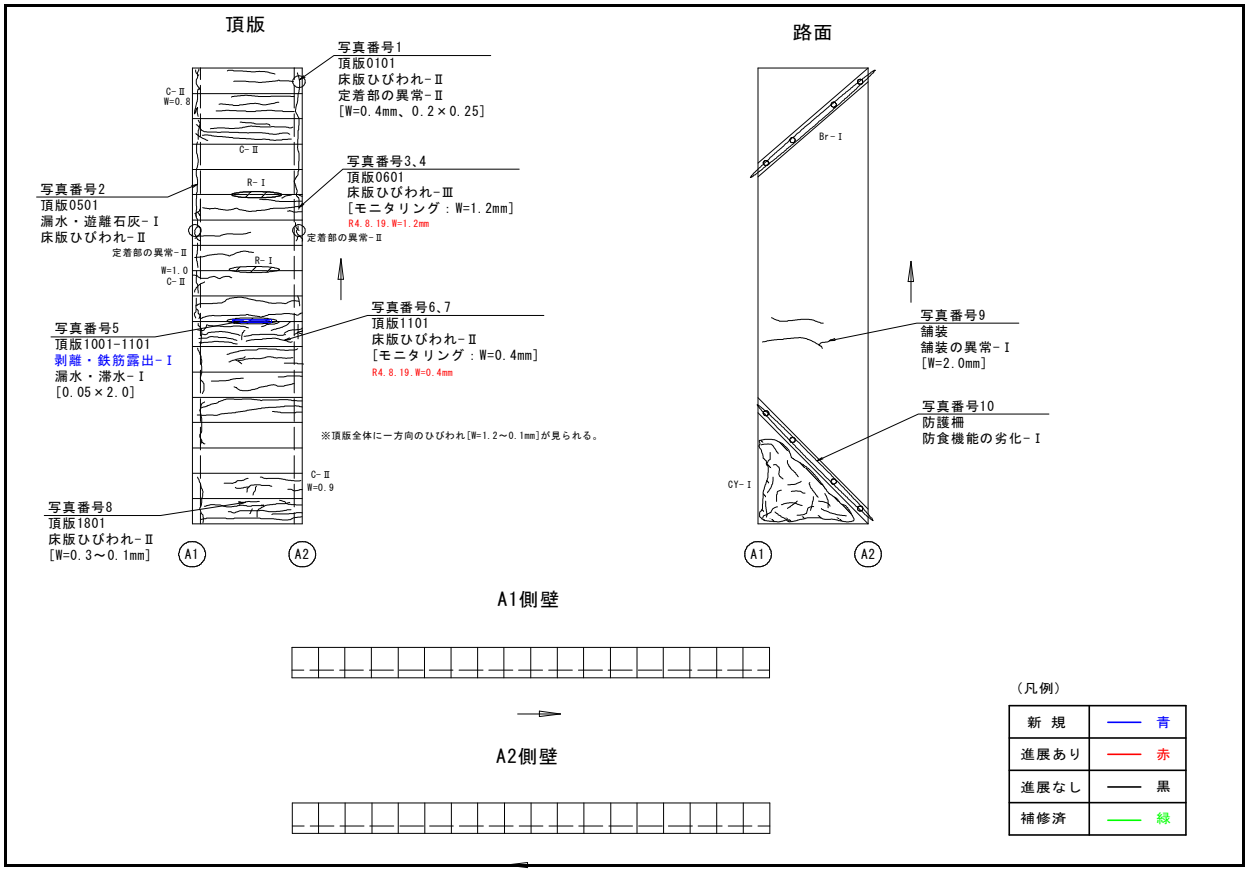

【諸元】

架設年次	橋長	幅員
2000年	4.15m	13.92m
橋梁形式		
ボックスカルバート、側壁		

【損傷概要】

頂版全体に一方向のひびわれ、遊離石灰を伴うひびわれが見られる。ひびわれの幅は大きく機能の低下が疑われる。

概算工事費（諸経費込み）

項目		単価	単位	補修数量	補修費(千円)
頂版	ひび割れ注入	14	m	122	1,708
	断面修復	2478	m^3	0	0
	表面保護	6	m^2	0	0
	吊り足場	4.2	m^2	0	0
	計				**1,708**
側壁	ひび割れ注入	14	m	0	0
	断面修復	2478	m^3	0	0
	表面保護	6	m^2	0	0
	枠組足場	2	m^2	0	0
	計				**0**
橋面防水・舗装打ち替え		6	m^2	0	**0**
弾性シール材充填		50	m	0	**0**

補修費　1708（千円）

5割増補修費　2562

補修費						2,562
共通仮設費						700
共通仮設費（率計上）	橋梁保全工事　地方部影響なし	式			27.32	700
純工事費		式	1			3,262
現場管理費	橋梁保全工事　地方部影響なし	式	1		64.97	2,119
工事原価		式	1			5,381
一般管理費		式	1		22.72	1,223
工事価格		式	1			6,604

合計　**6,604**（千円）

対策年　令和8年（2026年）

115_前川橋　　健全度　Ⅱ　　【点検年月：令和元年12月】

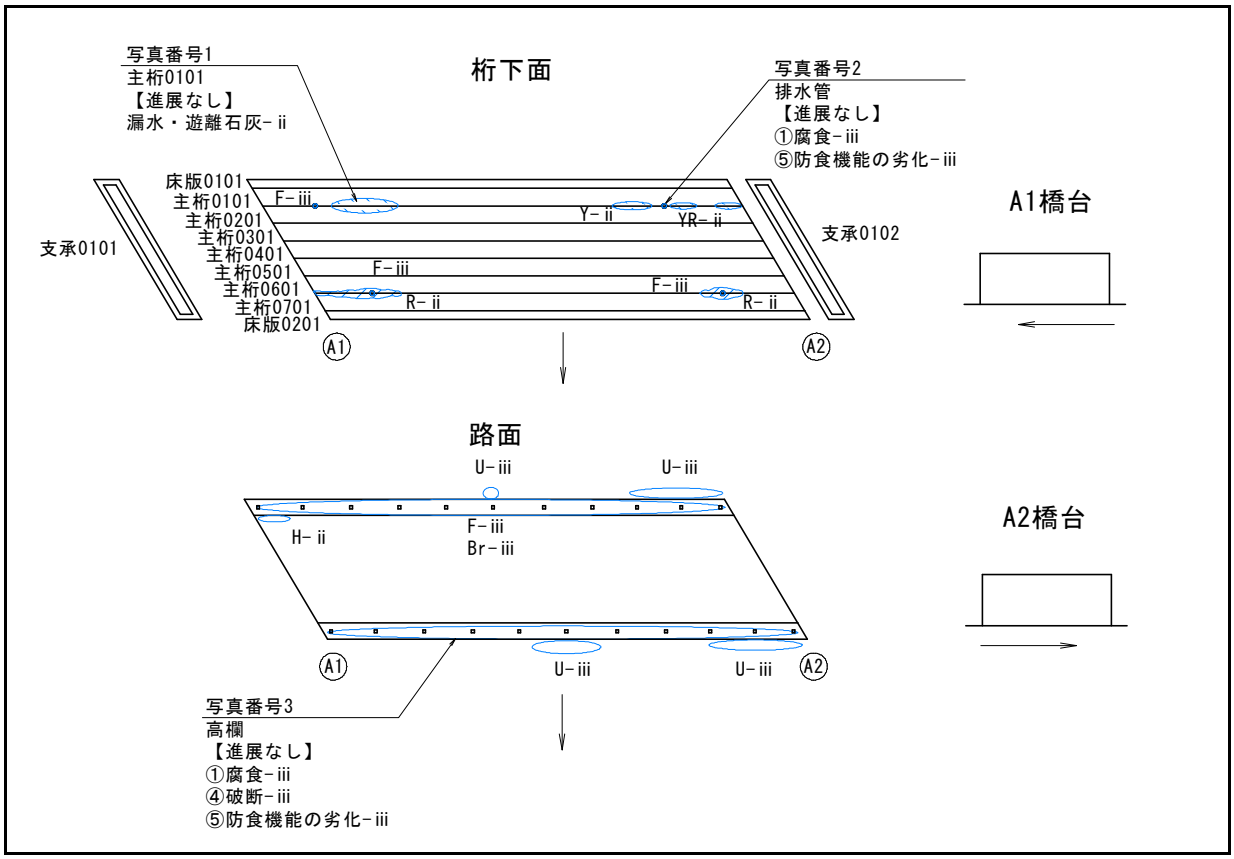

【諸元】

架設年次	橋長	幅員
1991年	17.85m	5.20m
橋梁形式		
プレテン床版橋、重力式橋台		

【損傷概要】

主桁間詰め部から軽微な漏水・遊離石灰が発生している。

概算工事費（諸経費込み）

項目		単価	単位	補修数量	補修費(千円)
主桁・床版	ひび割れ注入	14	m	0	0
	断面修復	2478	m^3	0	0
	表面保護	6	m^2	0	0
	吊り足場	4.2	m^2	0	0
	計				**0**
橋台	ひび割れ注入	14	m	0	0
	断面修復	2478	m^3	0	0
	表面保護	6	m^2	0	0
	枠組足場	2	m^2	0	0
	計				**0**
防護柵塗装塗り替え		5.5	m^2	50	**275**
排水管		70	箇所	4	**280**

補修費　555（千円）

5割増補修費　833

補修費						833
共通仮設費						227
共通仮設費（率計上）	橋梁保全工事　地方部影響なし	式			27.32	227
純工事費		式	1			1,060
現場管理費	橋梁保全工事　地方部影響なし	式	1		64.97	688
工事原価		式	1			1,748
一般管理費		式	1		22.72	397
工事価格		式	1			2,145

合計　**2,145**（千円）

対策年　令和9年（2027年）

163_亀尻橋　　健全度　Ⅱ　　【点検年月：令和元年12月】

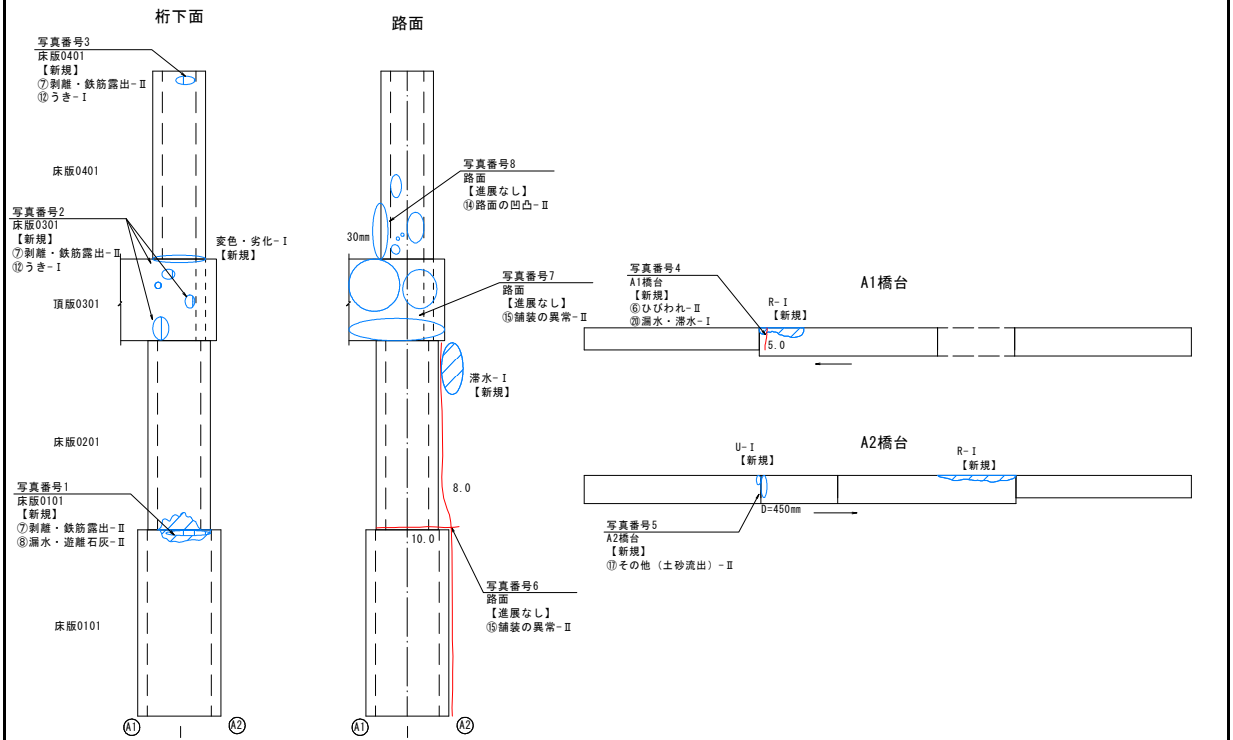

【諸元】

架設年次	橋長	幅員
1953年	2.60m	19.70m
橋梁形式		
RC床版橋、重力式橋台		

【損傷概要】

床版にうき、剥離・鉄筋露出が発生しており、露出した鉄筋に表面的な腐食が見られる。

概算工事費（諸経費込み）

項目		単価	単位	補修数量	補修費(千円)
頂版	ひび割れ注入	14	m	0	0
	断面修復	2478	m^3	0.05	124
	表面保護	6	m^2	0	0
	吊り足場	4.2	m^2	0	0
	計				**124**
側壁	ひび割れ注入	14	m	0.7	10 (A1)
	断面修復	2478	m^3	0	0
	表面保護	6	m^2	0	0
	枠組足場	2	m^2	0	0
	計				**10**
橋面防水・舗装打ち替え		6	m^2	0	**0**
弾性シール材充填		50	m	0	**0**

補修費　134（千円）

5割増補修費　201

補修費						201
共通仮設費						55
共通仮設費（率計上）	橋梁保全工事　地方部影響なし	式			27.32	55
純工事費		式	1			256
現場管理費	橋梁保全工事　地方部影響なし	式	1		64.97	166
工事原価		式	1			422
一般管理費		式	1		22.72	96
工事価格		式	1			518

合計　**518**（千円）

対策年　令和9年（2027年）

133_妻波橋　　健全度　Ⅱ　　【点検年月：令和3年2月】

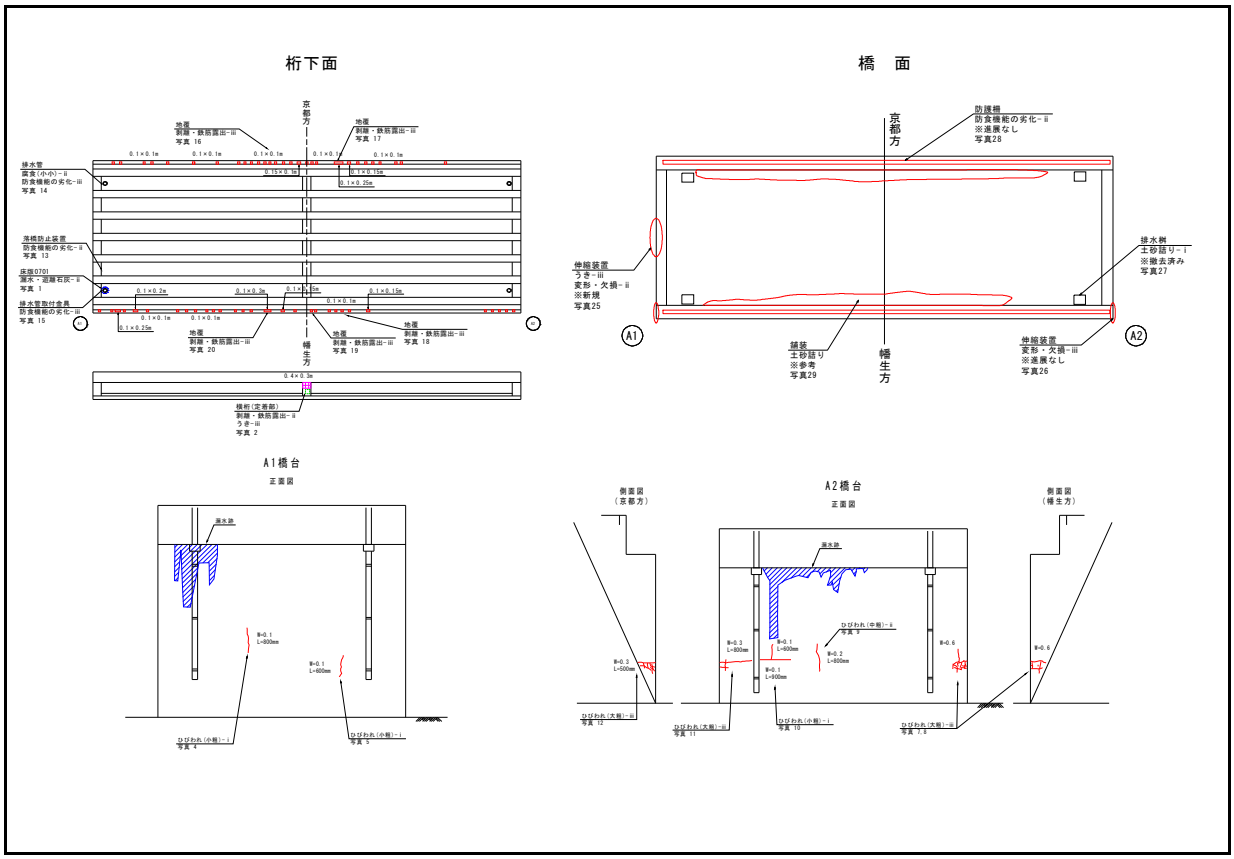

【諸元】

架設年次	橋長	幅員
1984年	19.90m	7.20m
橋梁形式		
単純PCT桁橋、逆T式橋台		

【損傷概要】

地覆の鉄筋露出が多数あるため状況に応じて補修することが望ましい。

概算工事費（諸経費込み）

項目		単価	単位	補修数量	補修費(千円)	
主桁・床版	ひび割れ注入	14	m	5	70	
	断面修復	2478	m^3	0.04	99	
	表面保護	6	m^2	0	0	
	吊り足場	4.2	m^2	0	0	
	計				**169**	
橋台	ひび割れ注入	14	m	1.4	20	(A1)
				6.6	92	(A2)
	断面修復	2478	m^3	0	0	
	表面保護	6	m^2	0	0	
	枠組足場	2	m^2	0	0	
	計				**112**	
橋面防水・舗装打ち替え		6	m^2	0	**0**	
弾性シール材充填		50	m	0	**0**	

補修費　281（千円）

5割増補修費　422

補修費						422
共通仮設費						115
共通仮設費（率計上）	橋梁保全工事　地方部影響なし	式			27.32	115
純工事費		式	1			537
現場管理費	橋梁保全工事　地方部影響なし	式	1		64.97	349
工事原価		式	1			886
一般管理費		式	1		22.72	201
工事価格		式	1			1,087

合計　**1,087**（千円）

対策年　令和9年（2027年）

140_井上橋　　健全度　Ⅱ　　【点検年月：令和3年2月】

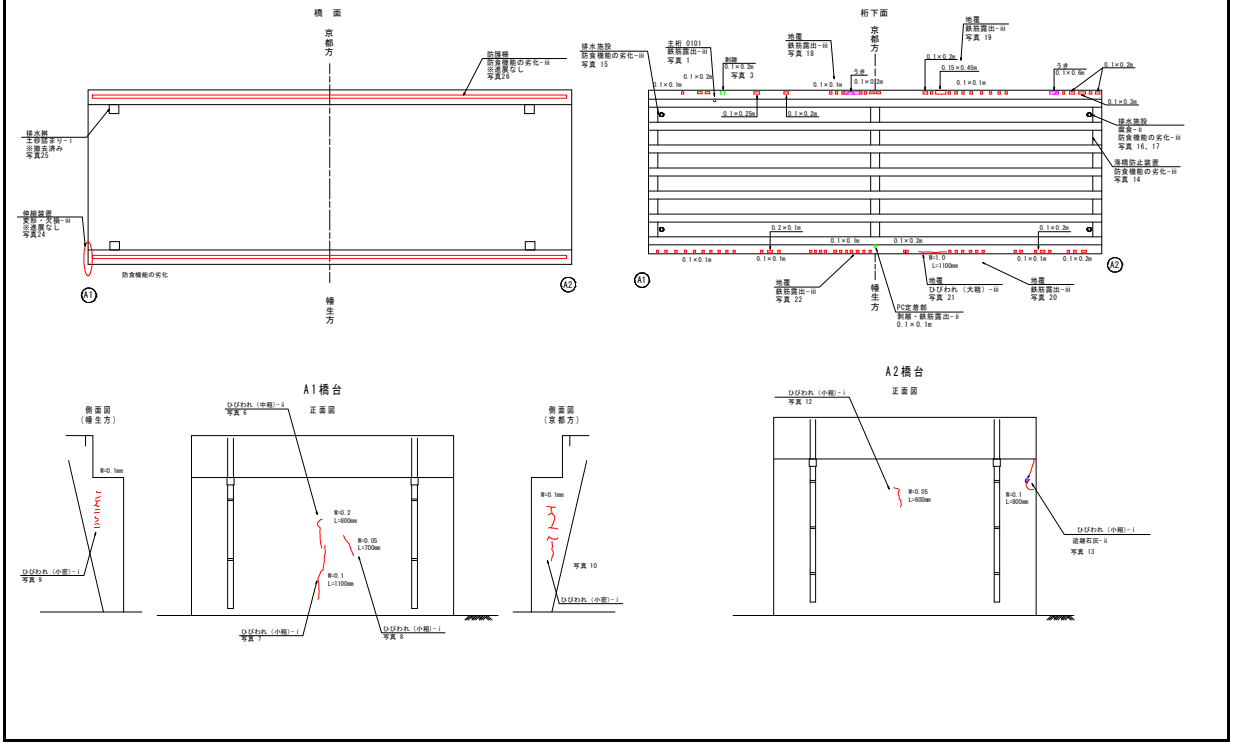

【諸元】

架設年次	橋長	幅員
1984年	19.90m	7.20m
橋梁形式		
プレテンPC単純T桁橋 逆T式橋台		

【損傷概要】

地覆の鉄筋露出が多数あるため状況に応じて補修することが望ましい。

概算工事費（諸経費込み）

項目		単価	単位	補修数量	補修費(千円)	
主桁・床版	ひび割れ注入	14	m	1.1	15	
	断面修復	2478	m^3	0.06	149	
	表面保護	6	m^2	0	0	
	吊り足場	4.2	m^2	0	0	
	計				**164**	
橋台	ひび割れ注入	14	m	7.1	99	(A1)
				1.4	20	(A2)
	断面修復	2478	m^3	0	0	
	表面保護	6	m^2	0	0	
	枠組足場	2	m^2	0	0	
	計				**119**	
橋面防水・舗装打ち替え		6	m^2	0	**0**	
弾性シール材充填		50	m	0	**0**	

補修費　283（千円）

5割増補修費　425

補修費						425
共通仮設費						116
共通仮設費（率計上）	橋梁保全工事　地方部影響なし	式			27.32	116
純工事費		式	1			541
現場管理費	橋梁保全工事　地方部影響なし	式	1		64.97	351
工事原価		式	1			892
一般管理費		式	1		22.72	203
工事価格		式	1			1,095

合計　**1,095**（千円）

対策年　令和9年（2027年）

144_塚畑橋　　健全度　Ⅱ　　【点検年月：令和3年2月】

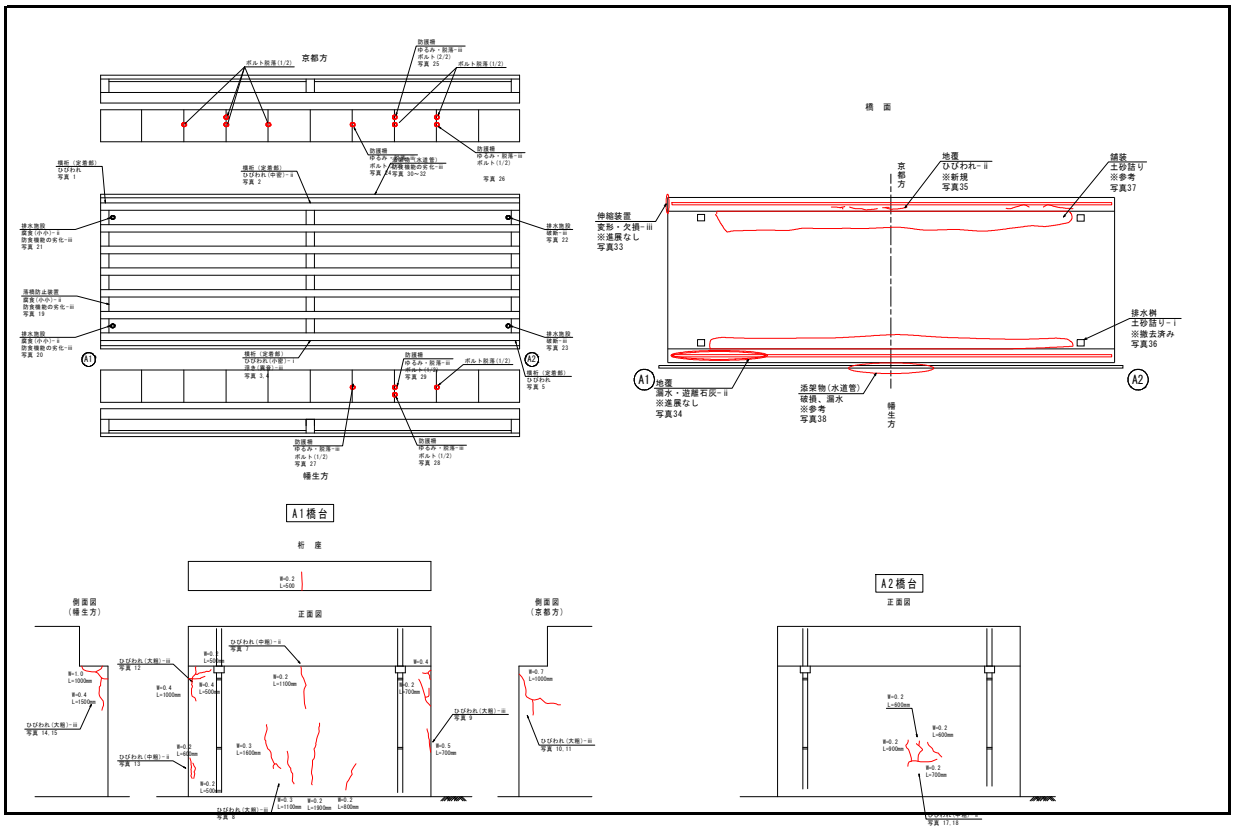

【諸元】

架設年次	橋長	幅員
1983年	19.90m	7.20m
橋梁形式		
単純PCT桁橋、逆T式橋台		

【損傷概要】

A1橋台のひびわれは幅が大きいため補修することが望ましい。

概算工事費（諸経費込み）

項目		単価	単位	補修数量	補修費(千円)	
主桁・床版	ひび割れ注入	14	m	0	0	
	断面修復	2478	m^3	0	0	
	表面保護	6	m^2	0	0	
	吊り足場	4.2	m^2	0	0	
	計				**0**	
橋台	ひび割れ注入	14	m	20.0	280	(A1)
				2.8	39	(A2)
	断面修復	2478	m^3	0	0	
	表面保護	6	m^2	0	0	
	枠組足場	2	m^2	0	0	
	計				**319**	
橋面防水・舗装打ち替え		6	m^2	0	**0**	
弾性シール材充填		50	m	0	**0**	

補修費　319（千円）

5割増補修費　479

補修費						479
共通仮設費						131
共通仮設費（率計上）	橋梁保全工事　地方部影響なし	式			27.32	131
純工事費		式	1			610
現場管理費	橋梁保全工事　地方部影響なし	式	1		64.97	396
工事原価		式	1			1,006
一般管理費		式	1		22.72	229
工事価格		式	1			1,235

合計　**1,235**（千円）

対策年　令和9年（2027年）

78_竹ケ鼻橋　　健全度　Ⅱ　　【点検年月：令和元年12月】

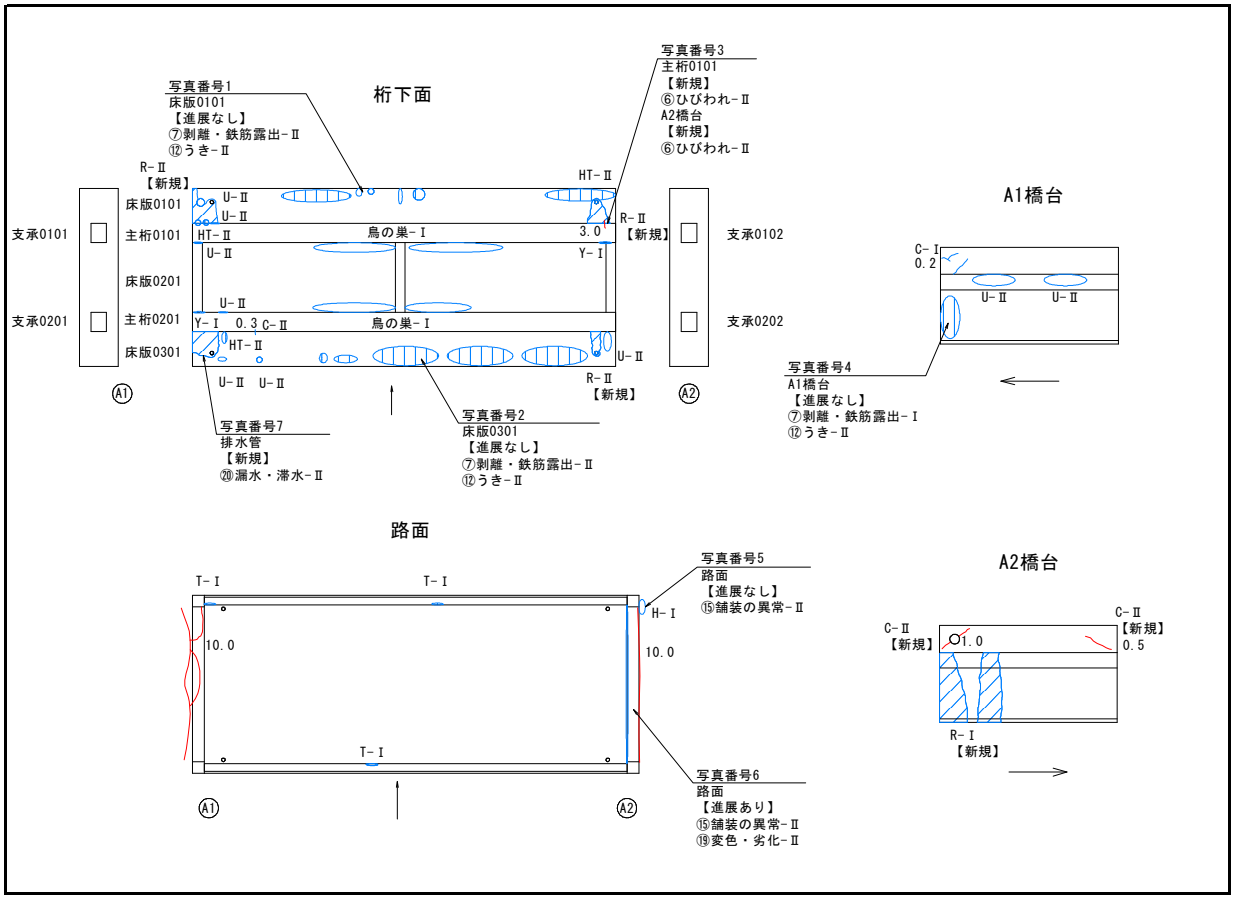

【諸元】

架設年次	橋長	幅員
1965年	10.95m	4.60m
橋梁形式		
RCT桁橋、重力式橋台		

【損傷概要】

主桁端部にW=3.0㎜のひびわれが斜めに見られる。

概算工事費（諸経費込み）

項目		単価	単位	補修数量	補修費(千円)	
主桁・床版	ひび割れ注入	14	m	0.6	8	
	断面修復	2478	m^3	0.25	620	
	表面保護	6	m^2	74.5	447	
	吊り足場	4.2	m^2	0	0	
	計				**1,075**	
橋台	ひび割れ注入	14	m	1.4	20	(A2)
	断面修復	2478	m^3	0.04	99	(A1)
	表面保護	6	m^2	0	0	
	枠組足場	2	m^2	0	0	
	計				**119**	
橋面防水・舗装打ち替え		6	m^2	44.9	**269**	
弾性シール材充填		50	m	0	**0**	

補修費　1463（千円）

5割増補修費　2195

補修費						2,195
共通仮設費						600
共通仮設費（率計上）	橋梁保全工事　地方部影響なし	式			27.32	600
純工事費		式	1			2,795
現場管理費	橋梁保全工事　地方部影響なし	式	1		64.97	1,816
工事原価		式	1			4,611
一般管理費		式	1		22.72	1,048
工事価格		式	1			5,659

合計　**5,659**（千円）

対策年　令和9年（2027年）

121_三条橋　　健全度　Ⅱ　　【点検年月：令和元年12月】

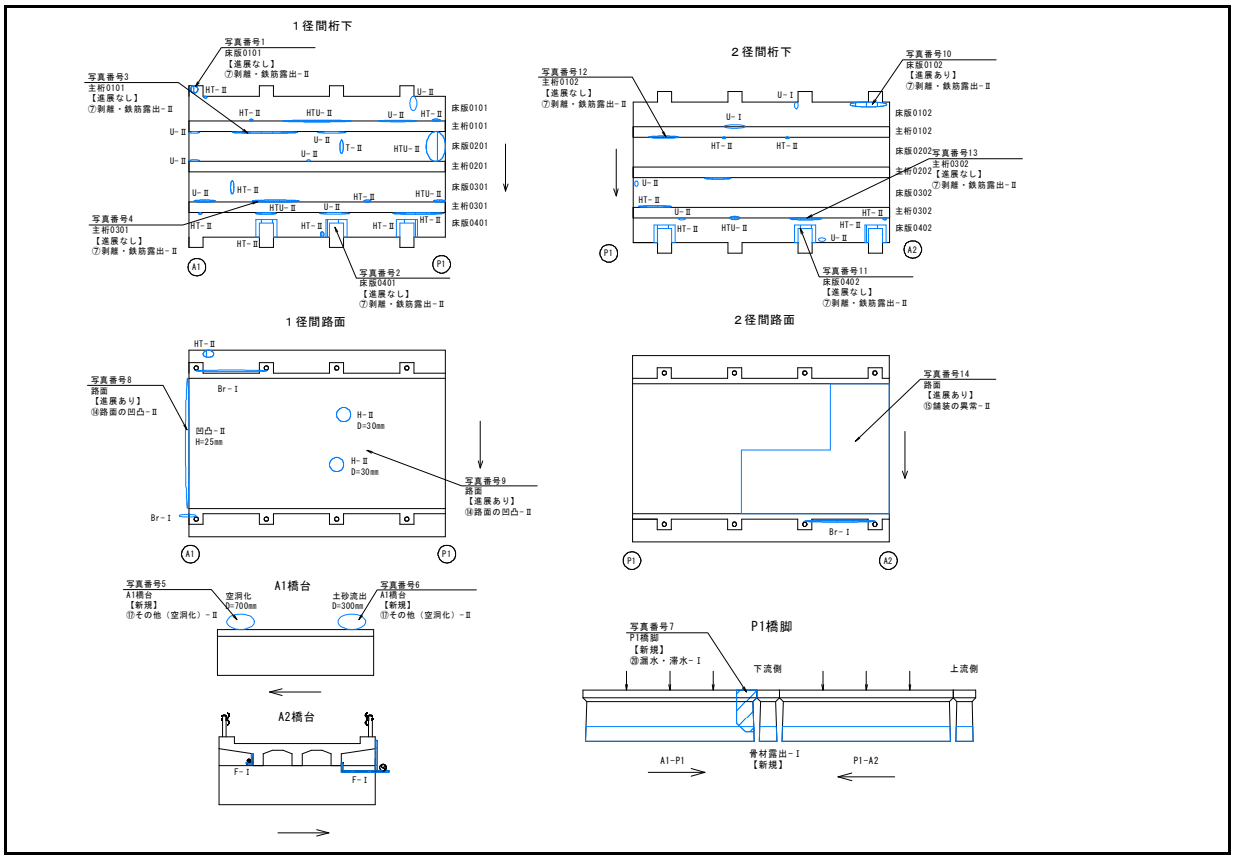

【諸元】

架設年次	橋長	幅員
1935年	14.60m	4.60m
橋梁形式		
RCT桁橋、重力式橋台壁式橋脚		

【損傷概要】

主桁側面に小規模な鉄筋露出が多数発生しており、一部主筋が露出している。

概算工事費（諸経費込み）

項目		単価	単位	補修数量	補修費(千円)
主桁・床版	ひび割れ注入	14	m	0	0
	断面修復	2478	m^3	0.07	173
	表面保護	6	m^2	97.8	587
	吊り足場	4.2	m^2	67.2	282
	計				**1,043**
橋台・橋脚	ひび割れ注入	14	m	0	0
	断面修復	2478	m^3	0	0
	表面保護	6	m^2	0	0
	枠組足場	2	m^2	0	0
	計				**0**
橋面防水・舗装打ち替え		6	m^2	54.0	**324**
弾性シール材充填		50	m	0	**0**

補修費　1367（千円）

5割増補修費　2050

補修費						2,050
共通仮設費						560
共通仮設費（率計上）	橋梁保全工事　地方部影響なし	式			27.32	560
純工事費		式	1			2,610
現場管理費	橋梁保全工事　地方部影響なし	式	1		64.97	1,696
工事原価		式	1			4,306
一般管理費		式	1		22.72	978
工事価格		式	1			5,284

合計　**5,284**（千円）

対策年　令和9年（2027年）

147_西穂波橋　　健全度　Ⅱ　　【点検年月：令和2年12月】

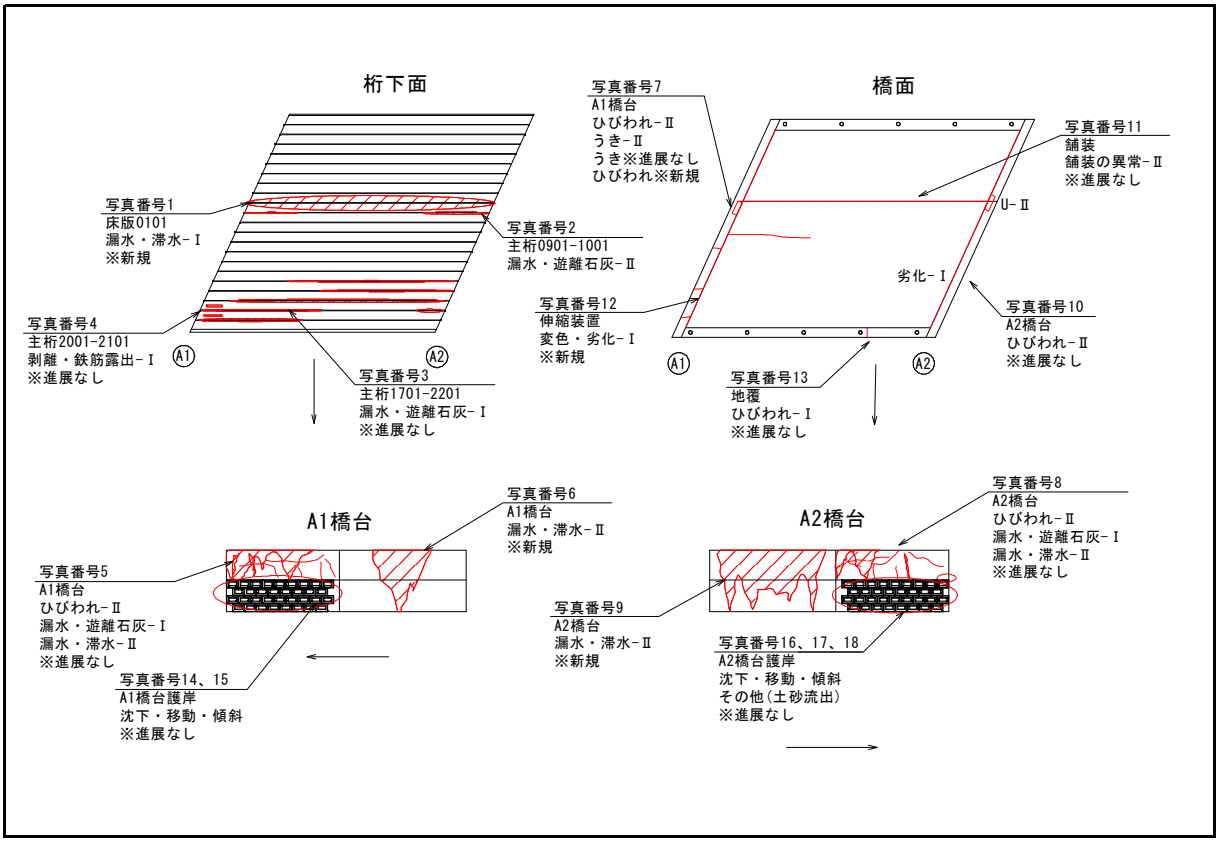

【諸元】

架設年次	橋長	幅員
不明	8.65m	7.70m
橋梁形式		
PC単純床版橋、逆T式橋台		

【損傷概要】

主桁間詰め部に遊離石灰が見られ、橋台竪壁にひびわれ、遊離石灰、漏水が発生している。

概算工事費（諸経費込み）

項目		単価	単位	補修数量	補修費(千円)
主桁・床版	ひび割れ注入	14	m	0	0
	断面修復	2478	m^3	0	0
	表面保護	6	m^2	0	0
	吊り足場	4.2	m^2	0	0
	計				**0**
橋台	ひび割れ注入	14	m	6.5	91 (A1)
				4.7	66 (A2)
	断面修復	2478	m^3	0	0
	表面保護	6	m^2	0	0
	枠組足場	2	m^2	0	0
	計				**157**
橋面防水・舗装打ち替え		6	m^2	60.1	**361**
弾性シール材充填		50	m	13.9	**695**

補修費　1212（千円）

5割増補修費　1819

補修費						1,819
共通仮設費						497
共通仮設費（率計上）	橋梁保全工事　地方部影響なし	式			27.32	497
純工事費		式	1			2,316
現場管理費	橋梁保全工事　地方部影響なし	式	1		64.97	1,504
工事原価		式	1			3,820
一般管理費		式	1		22.72	868
工事価格		式	1			4,688

合計　**4,688**（千円）
